登米市　橋梁長寿命化修繕計画

令和6年6月

宮城県登米市

目　　次

1. 長寿命化修繕計画の目的　P. 1

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁　P. 1

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針　P. 2

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針　P. 3

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架け替え時期　P. 3

6. 新技術の活用について　P. 4

7. 長寿命化修繕計画による効果　P. 5

8. 計画策定担当部署及び意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者　P. 5

9. 橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表　P. 6～31

橋 梁 長 寿 命 化 修 繕 計 画

1. 長寿命化修繕計画の目的

1)背景

登米市が長寿命化修繕計画を策定する橋梁は令和6年4月現在で1254橋あり、建設後50年を経過した高齢化橋梁は現在のところ7%ですが、10年後には約48%に達し、20年後には約80%に達する見込みであり、橋梁の高齢化が急速に進みます。
今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架け替えに要する経費に対し、計画的なコスト縮減への取り組みが不可欠となります。

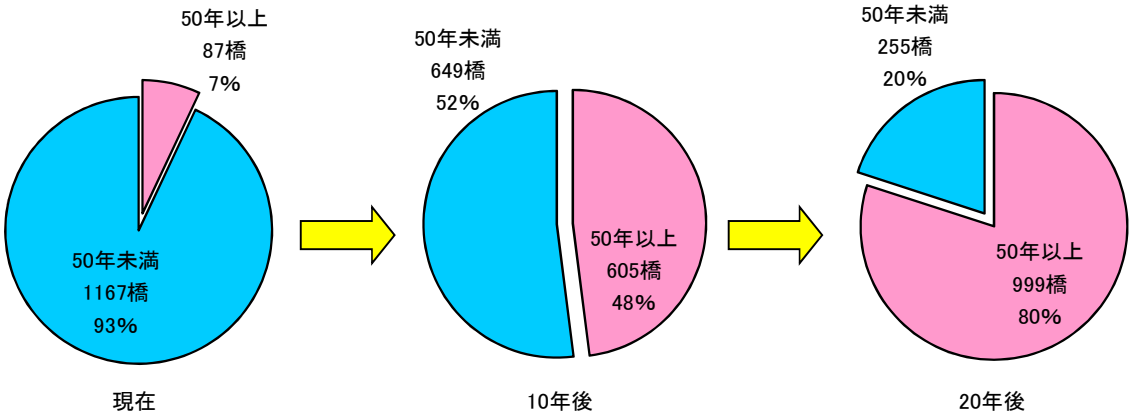

図1. 建設後50年以上の橋梁の推移

2)目的

従来の損傷・劣化が大きくなってから対策を実施する事後保全(大規模補修 高コスト)から、損傷・劣化が小さいうちから対策を実施する予防保全(小規模補修 低コスト)へと移行することでライフサイクルコストの縮減を図るとともに、適切な維持管理を継続的に行うことで地域道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することを目的とします。

2. 長寿命化修繕計画の対象橋梁

	一級市道	二級市道	その他市道	合計
管理橋梁数	135	68	1051	1254

3. 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

橋梁を適正に維持管理するため、通常点検・定期点検・異常時点検等の点検を実施しています。

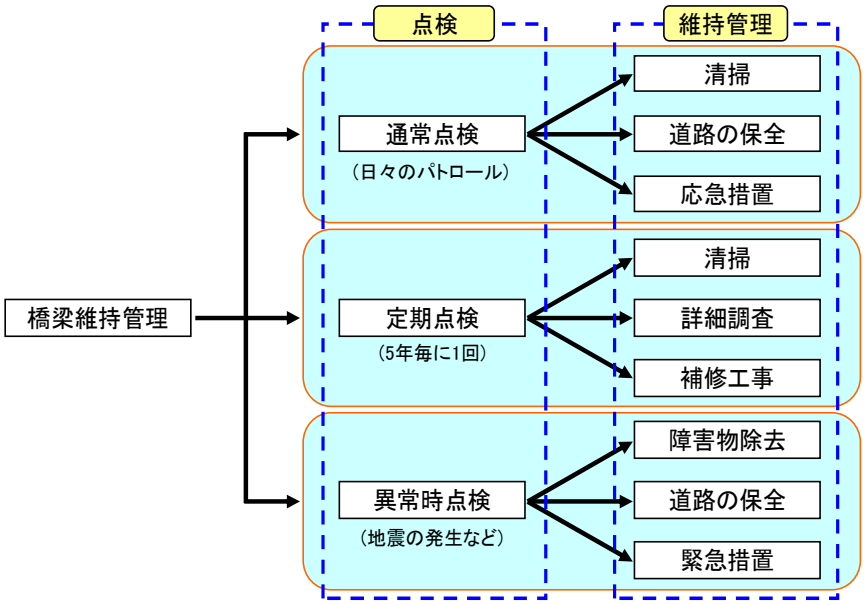

1）健全度の把握の基本的な方針

橋梁の架設年度や立地条件などを十分に考慮し、「橋梁定期点検要領 平成31年3月 国土交通省道路局国道・技術課」に基づいて定期的に点検を実施し、橋梁の損傷状況を把握します。
定期点検では、新技術としてタブレットを活用した損傷箇所の調査を実施します。また、令和6年度以降に点検を実施する全ての橋梁において、新技術の活用を検討し、さらなる費用縮減や点検の効率化を図ります。

2）日常的な維持管理に関する基本的な方針

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、道路パトロールおよび清掃などの実施を徹底します。

写真1. 路面

写真2. 排水ます

写真3. 支承本体

4. 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

長寿命化修繕計画を策定する場合、「事後保全型」と「予防保全型」の維持管理シナリオによるライフサイクルコストを比較し、検討を行います。

シナリオ	説明
予防保全型	損傷が顕在化する前の軽微なうちに計画的に行う橋梁の修繕。 小規模工事。工事期間が短く、低コスト。
事後保全型	損傷が顕在化した段階になって行う橋梁の修繕および架け替え。 大規模工事。工事期間が長く、高コスト。

予防的な修繕・補修などの実施を徹底することにより、修繕・架け替えに係る費用の低コスト化を図り、ライフサイクルコストの縮減を目指します。

令和4年度以降に補修検討を実施する全ての橋梁において、様々な新技術（あるいは新技術に類する技術）活用の検討を実施し、費用縮減や事業の効率化を図ります。

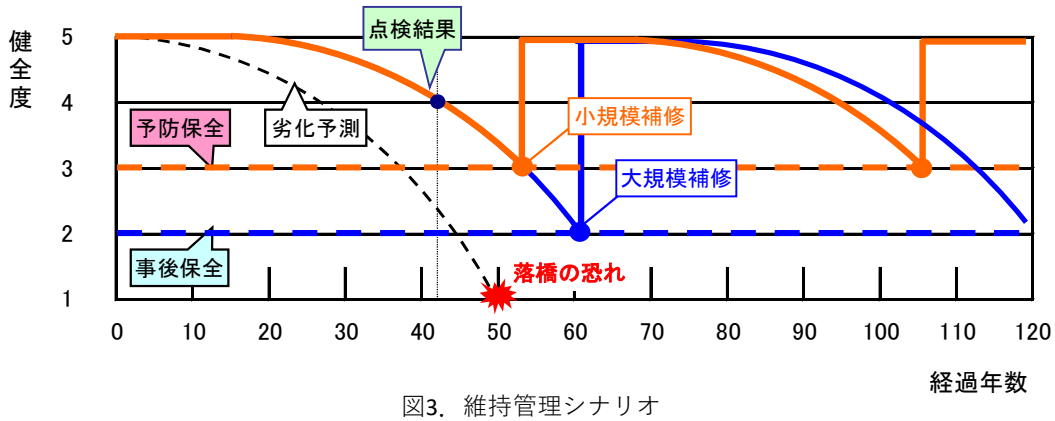

図3. 維持管理シナリオ

5. 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架け替え時期

1）点検

今年度計画を策定した1254橋について次回計画策定時期は2028年度を見込みとし、日常点検および定期点検を継続的に実施します。

2）修繕又は架け替え対策

今年度計画を策定した1254橋について劣化予測から修繕時期を算定し、修繕および架け替え対策を実施する予定です。また、損傷状況および路線重要度から優先順位の高い橋梁より補修工事を実施します。

上記の修繕および架け替え対策橋梁については、今後、定期点検を実施していく過程で確認される損傷に応じて優先的に補修工事を要する場合もあり、定期点検毎に見直しを図ります。

3）集約化・撤去

点検の結果判定区分Ⅲとなった橋梁のうち、迂回路が存在し集約が可能と考えられる橋梁について、施設の利用状況や地域の意見を踏まえ、令和10年度までに3橋程度の集約化・撤去の検討を行い、100万円のコスト縮減を目指します。

6. 新技術等の活用について

1）新技術等の活用方針について

従来技術で実施する橋梁定期点検において、橋梁点検システムを活用することでタブレット端末を現地にて使用し前回点検の内容と現在の損傷や劣化等を比較し、タブレット端末からかシステムへ直接入力し、点検調書入力等の点検業務の効率化・簡便化を図ることでコスト縮減を目指します。
また、点検により判定区分Ⅲとなった橋梁の補修検討を行う際は、新技術（あるいは新技術に類する技術）と従来技術の比較検討を行い費用縮減や業務の効率化を図ります。

2）新技術等の活用に関する数値目標について

令和6年度から令和10年度の橋梁定期点検(N=1254橋)において、現地点検時に橋梁点検システムを活用し現地点検時にタブレット端末より直接入力することで点検業務の効率化が図り、約6900万円のコスト縮減を目指します。
また、橋梁の補修検討を行う際は新技術（あるいは新技術に類する技術）と従来技術の比較検討を行い費用縮減や業務の効率化を図り、令和10年度までに100万円のコスト縮減を目指します。

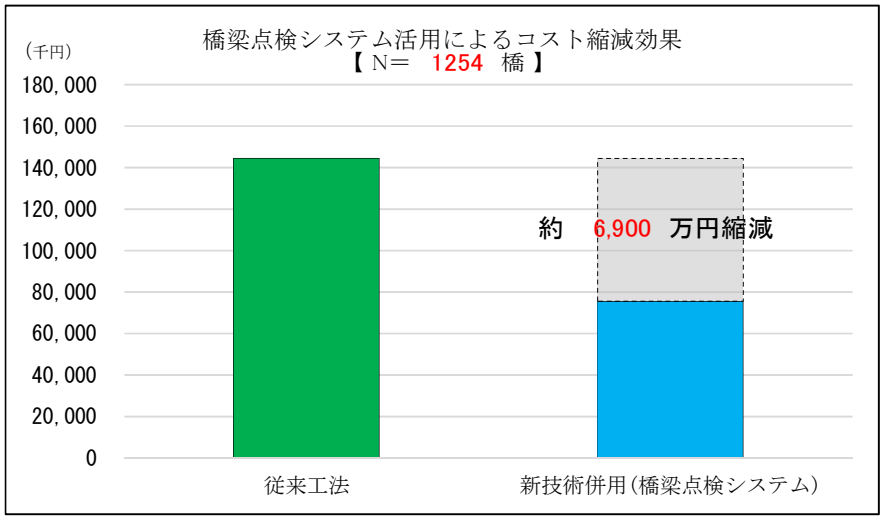

7. 長寿命化修繕計画による効果

以下に、今後の修繕および架け替えにかかる費用についてシミュレーションを行ったものを示します。

2073年までに事後保全による補修費用は約275億円かかるのに対し、予防保全による補修費用は約165億円（110億円の縮減）となり、約40%の縮減が見込まれます。

	シナリオ	対象年	補修費用
試算シミュレーション①	予防保全	50年	16,505百万円
試算シミュレーション②	事後保全	50年	27,520百万円

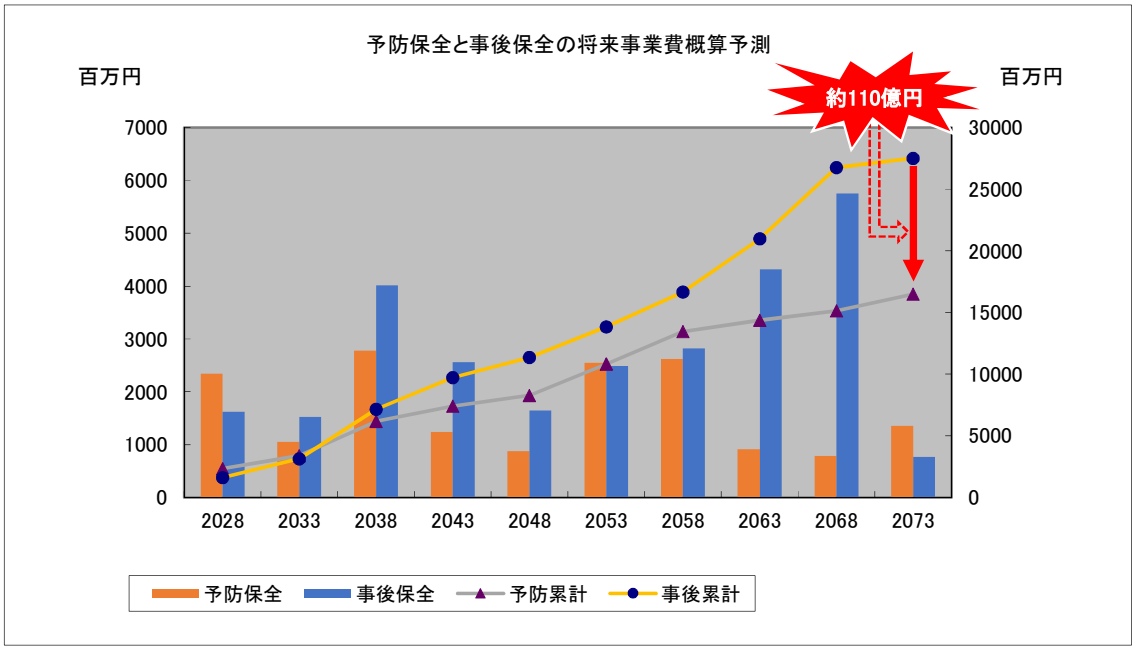

8. 担当部署及び長寿命化修繕計画策定に関わる学識経験者等の専門知識を有する者

1）計画策定担当部署

登米市　道路課　Tel:　0220－34－2315

2）長寿命化修繕計画策定に関わる学識経験者等の専門知識を有する者

東北大学大学院工学研究科
インフラ・マネジメント研究センター
センター長　久田 真 教授

9. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
1	穴山橋	24.0m	1径間	PC橋	T 桁	1981年	指定なし	1級	荒川	Ⅱ
2	鷺橋	20.6m	1径間	PC橋	T 桁	1982年	1次	1級	長沼川	Ⅱ
3	仮屋橋	49.0m	1径間	鋼橋	箱桁	1999年	指定なし	1級	荒川	Ⅰ
4	三方島西橋	100.0m	3径間	鋼橋	桁橋	1999年	指定なし	その他	長沼ダム導水路	Ⅱ
5	舟橋	24.7m	4径間	鋼橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	荒川	Ⅱ
6	蓮沼橋	20.4m	4径間	RC橋	床版橋	1981年	指定なし	その他	荒川	Ⅱ
7	寺志田橋	31.5m	2径間	PC橋	床版橋	2014年	指定なし	その他	瀬峰川	Ⅱ
8	高石排水路3号橋	15.4m	1径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1972年	指定なし	その他	高石排水路	Ⅱ
9	萩洗橋	20.9m	1径間	PC橋	T 桁	1997年	指定なし	その他	長沼川	Ⅱ
10	舟橋側道橋	21.3m	1径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1985年	指定なし	1級	新堰用水路	Ⅱ
11	斜橋側道橋	20.3m	1径間	鋼橋	H 桁	1991年	指定なし	1級	新堰用水路	Ⅱ
12	中橋側道橋	15.2m	1径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1989年	指定なし	1級	新川	Ⅰ
13	平杉橋	31.5m	1径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1989年	指定なし	その他	羽沢川	Ⅱ
14	皮袋橋	27.7m	2径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1981年	指定なし	その他	羽沢川	Ⅱ
15	四ヶ村堀橋	17.3m	1径間	PC橋	箱桁	1986年	指定なし	その他	登米1号幹線排水路	Ⅱ
16	梅の木橋	19.2m	1径間	PC橋	床版橋	1979年	指定なし	2級	岩の沢川	Ⅱ
17	雄平橋	16.1m	1径間	PC橋	床版橋	1977年	指定なし	2級	畑の沢川	Ⅱ
18	新三滝堂橋	46.0m	1径間	鋼橋	H桁	1986年	指定なし	2級	大関川	Ⅱ
19	昭和橋	60.1m	2径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1998年	指定なし	その他	二股川	Ⅰ
20	西内橋	29.0m	2径間	PC橋	床版橋	1987年	指定なし	その他	二股川	Ⅰ
21	箸木橋	30.8m	1径間	鋼橋	H 桁	1960年	指定なし	2級	二股川	Ⅱ
22	鱒渕観音橋	29.2m	1径間	PC橋	T 桁	1997年	指定なし	その他	鱒渕川	Ⅱ
23	崖の下橋	15.5m	1径間	鋼橋	H 桁	1974年	指定なし	その他	綱木川	Ⅰ
24	柿の木前橋	24.2m	1径間	鋼橋	H 桁	2004年	指定なし	その他	大関川	Ⅰ
25	日陰橋	17.5m	1径間	鋼橋	H 桁	1982年	指定なし	その他	南の沢川	Ⅱ
26	佐辺野橋	45.0m	4径間	鋼橋	H 桁	1978年	指定なし	その他	二股川	Ⅲ
27	鷹の子橋	30.3m	3径間	RC橋	床版橋	1959年	指定なし	その他	二股川	Ⅱ
28	長畑橋	30.0m	2径間	鋼橋	H 桁	1967年	指定なし	その他	二股川	Ⅱ
29	大神橋	18.9m	1径間	鋼橋	H 桁	1981年	指定なし	その他	鱒渕川	Ⅰ
30	裏観音橋	29.6m	1径間	PC橋	箱桁	1988年	指定なし	その他	鱒渕川	Ⅰ
31	山崎1号橋	15.6m	1径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1987年	指定なし	その他	大貫澤	Ⅰ
32	軽米橋	19.7m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	鱒渕川	Ⅰ
33	古堂橋	31.3m	1径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1992年	指定なし	その他	綱木沢川	Ⅰ
34	竹の下橋	23.9m	2径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1983年	指定なし	その他	二股川	Ⅱ
35	五反田橋	20.4m	1径間	PC橋	床版橋	1993年	指定なし	その他	岩之沢川	Ⅱ
36	二股橋	145.6m	3径間	鋼橋	桁橋	1987年	指定なし	1級	二股川	Ⅱ
37	落合橋	42.1m	1径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1984年	指定なし	1級	大関川	Ⅰ
38	六本橋	20.6m	1径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1987年	指定なし	1級	岩之澤川	Ⅰ
39	朴の沢橋	15.3m	1径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1975年	指定なし	1級	綱木川	Ⅱ
40	畑の沢4号橋	15.7m	1径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1982年	指定なし	1級	岩の沢川	Ⅱ
41	広瀬橋	37.0m	1径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1990年	指定なし	2級	大関川	Ⅱ
42	青木橋	40.0m	2径間	鋼橋	Ⅰ 桁	2010年	指定なし	2級	高寺沢川	Ⅱ
43	糠塚橋	15.0m	2径間	RC橋	Ⅰ 桁	2017年	指定なし	その他	糠塚排水路	Ⅰ
44	田中橋	15.7m	1径間	PC橋	T 桁	1985年	指定なし	その他	糠塚排水路	Ⅰ
45	新田外二番江1号橋	15.7m	1径間	PC橋	T 桁	1991年	指定なし	その他	八間大排水路	Ⅱ
46	上千貫橋	43.7m	2径間	鋼橋	H 桁	1986年	指定なし	1級	旧迫川	Ⅰ
47	田畑1号橋	26.3m	1径間	PC橋	T 桁	1989年	指定なし	1級	田畑幹線排水路	Ⅱ
48	中埣橋	192.1m	7径間	鋼橋	H桁	1976年	指定なし	1級	迫川	Ⅱ
49	田畑2号橋	22.4m	1径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1973年	指定なし	1級	田畑幹線排水路	Ⅱ
50	瀬ヶ崎橋	76.1m	3径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1977年	指定なし	2級	旧迫川	Ⅱ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
51	東千貫橋	26.7m	1径間	鋼橋	Ｉ 桁	1980年	指定なし	その他	古川	Ⅰ
52	舟入橋	15.4m	1径間	鋼橋	Ｉ 桁	1978年	指定なし	2級	米山幹線排水路	Ⅱ
53	犬子松橋	16.6m	1径間	鋼橋	Ｉ 桁	1983年	指定なし	その他	田畑幹線排水路	Ⅰ
54	喧嘩橋	45.2m	3径間	PC橋	Ｔ 桁	1983年	指定なし	その他	五ケ村堀	Ⅱ
55	田畑4号橋	20.4m	1径間	鋼橋	Ｉ 桁	1975年	指定なし	その他	田畑幹線排水路	Ⅱ
56	土佐ヶ淵橋	39.3m	2径間	PC橋	Ｔ 桁	1981年	指定なし	その他	五ケ村堀	Ⅱ
57	田畑3号橋	22.5m	1径間	鋼橋	Ｉ 桁	1975年	指定なし	その他	田畑幹線排水路	Ⅱ
58	立野橋	18.4m	1径間	鋼橋	Ｉ 桁	1990年	指定なし	その他	米山幹線排水路	Ⅰ
59	兵徳橋	93.5m	3径間	鋼橋	Ｉ 桁	1972年	指定なし	2級	夏川	Ⅱ
60	夏川ポンデザール	136.0m	3径間	鋼橋	Ｉ 桁	1995年	指定なし	その他	夏川	Ⅱ
61	田入道1号橋	15.5m	1径間	PC橋	Ｔ 桁	1996年	指定なし	その他	渋川排水路	Ⅰ
62	二ッ堀4号橋	18.6m	1径間	PC橋	Ｔ 桁	1991年	指定なし	その他	渋川排水路	Ⅰ
63	梶沼橋	33.2m	1径間	PC橋	箱桁	2001年	指定なし	1級	旧迫川	Ⅱ
64	月見橋	18.5m	1径間	鋼橋	Ｉ 桁	1977年	指定なし	2級	新川	Ⅰ
65	樟大橋	17.5m	1径間	鋼橋	Ｉ 桁	1990年	指定なし	その他	新川	Ⅰ
66	内海橋	15.5m	1径間	鋼橋	Ｉ 桁	1977年	指定なし	その他	新川	Ⅱ
67	若狭足洗橋	51.9m	3径間	PC橋	Ｔ 桁	1991年	指定なし	その他	旧迫川	Ⅱ
68	中川橋	53.2m	2径間	鋼橋	Ｉ 桁	2002年	指定なし	1級	南沢川	Ⅱ
69	やまのかみ橋	15.4m	1径間	PC橋	箱桁	1981年	指定なし	1級	石貝川	Ⅰ
70	中里橋	15.5m	1径間	PC橋	箱桁	1981年	指定なし	1級	石貝川	Ⅱ
71	河原向橋	18.5m	1径間	PC橋	箱桁	1984年	指定なし	1級	石貝川	Ⅱ
72	水沢橋	17.4m	1径間	鋼橋	Ｉ 桁	1988年	指定なし	2級	水沢川	Ⅱ
73	前田橋	25.3m	1径間	鋼橋	Ｉ 桁	1989年	指定なし	2級	大萱川	Ⅱ
74	天神橋	20.6m	1径間	PC橋	Ｔ 桁	1989年	指定なし	その他	大萱川	Ⅰ
75	北沢橋	24.7m	1径間	鋼橋	Ｉ 桁	1962年	指定なし	その他	北沢川	Ⅱ
76	深畑橋	19.7m	1径間	PC橋	箱桁	1992年	指定なし	その他	黄牛川	Ⅰ
77	四反田橋	22.5m	1径間	PC橋	箱桁	1996年	指定なし	その他	黄牛川	Ⅱ
78	大萱1号橋	15.5m	1径間	鋼橋	Ｉ 桁	1989年	指定なし	その他	大萱川	Ⅰ
79	大和田橋	42.6m	2径間	PC橋	桁橋	1994年	指定なし	その他	荒川	Ⅱ
80	大谷地橋	43.2m	3径間	PC橋	Ｔ 桁	1989年	指定なし	その他	五ケ村堀	Ⅱ
81	脇谷橋	19.9m	1径間	鋼橋	Ｉ 桁	1989年	指定なし	その他	岩之沢川	Ⅱ
82	五ケ村大橋	43.0m	3径間	PC橋	箱桁	1986年	指定なし	その他	五ケ村堀	Ⅱ
83	昭和新田橋	16.6m	1径間	PC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	田畑幹線排水路	Ⅱ
84	鳩峰橋	22.1m	1径間	PC橋	床版橋	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
85	大埣橋	22.5m	1径間	鋼橋	桁橋	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
86	北沢橋（北沢線）	41.5m	2径間	鋼橋	Ｉ 桁	1972年	指定なし	2級	河　川	Ⅲ
87	石崎橋	112.9m	4径間	鋼橋	I桁	1981年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
88	小谷地橋	32.3m	2径間	PC橋	Ｔ 桁	1962年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
89	橋向橋	42.6m	2径間	鋼橋	I桁	1978年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
90	野谷地橋	77.5m	3径間	鋼橋	Ｉ 桁	1976年	指定なし	2級	旧迫川	Ⅱ
91	駒見橋	57.0m	2径間	鋼橋	桁橋	2008年	指定なし	1級	荒川	Ⅰ
92	倉崎橋	99.2m	3径間	鋼橋	Ｉ 桁	2006年	指定なし	1級	長沼ダム導水路	Ⅱ
93	糠塚橋	99.2m	3径間	鋼橋	Ｉ 桁	2006年	指定なし	その他	長沼ダム導水路	Ⅱ
94	大内橋	21.0m	1径間	PC橋	箱桁	2010年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
95	鴻巣橋	22.8m	1径間	PC橋	箱桁	2005年	指定なし	2級	河　川	Ⅰ
96	北郷1号橋	2.2m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
97	北郷2号橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
98	竹ノ下土手根線1号橋	2.8m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
99	北郷3号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
100	北郷4号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
101	北郷5号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
102	新粒庭・新押込3号線1号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
103	山崎・長下田線1号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
104	矢作・黒山線1号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
105	竹ノ下土手根線2号橋	4.3m	1径間	BOX	BOX	1980年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
106	芦倉線1号橋	3.0m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
107	新加美田2号線1号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
108	南郷2号橋	10.5m	1径間	PC橋	桁橋	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
109	山根・石沢線1号橋	3.5m	1径間	RC橋	桁橋	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
110	平町千貫巻線1号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
111	山根・石沢線2号橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
112	前久保橋	2.5m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
113	新須崎前・新小高2号線1号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
114	吉地1号橋	6.8m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
115	山根前橋	5.6m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
116	上新田橋	5.6m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
117	山根1号橋	3.6m	1径間	BOX	BOX	2000年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
118	若柳橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	2000年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
119	明神堂橋	7.5m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
120	傾城淵橋	2.4m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
121	小谷地前1号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
122	小谷地前2号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
123	大樋橋	3.0m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
124	寺橋	3.3m	1径間	RC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
125	山根2号橋	3.5m	1径間	RC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
126	仲江1号橋	3.3m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
127	仲江2号橋	3.3m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
128	仲江3号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
129	新長下田1号線1号橋	4.0m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
130	西門沖7号橋	3.4m	1径間	RC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
131	西門沖6号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
132	西門沖1号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
133	西門沖2号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
134	西門沖3号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
135	西門沖4号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
136	西門沖5号橋	3.2m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
137	舘前1号橋	2.5m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
138	芦倉橋	2.2m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
139	堀内前橋	2.8m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
140	赤谷分校前橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	1980年	指定なし	2級	河　川	Ⅱ
141	丸谷地橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1980年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
142	河童1号橋	4.8m	1径間	BOX	BOX	1992年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
143	渋川3号橋	9.4m	1径間	PC橋	桁橋	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
144	渋川1号橋	8.5m	1径間	PC橋	桁橋	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
145	山根5号橋	2.0m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
146	葉ノ木立2号橋	3.6m	1径間	RC橋	桁橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
147	西久保橋	3.6m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
148	石沢橋	3.3m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
149	小沼橋	10.5m	1径間	PC橋	桁橋	1994年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
150	指橋1号橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
151	前久保橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
152	西とど橋	3.3m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
153	大根沢橋	2.6m	1径間	RC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
154	矢作橋	2.4m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
155	不動沢橋	2.5m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
156	二ツ堀橋	9.8m	1径間	PC橋	桁橋	1991年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
157	源内橋	10.6m	1径間	PC橋	桁橋	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
158	加慶橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
159	十八引橋	3.1m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
160	平町1号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	2級	河　川	Ⅱ
161	渋川8号橋	15.6m	1径間	PC橋	T　桁	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
162	馬場橋	2.8m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
163	二ツ掘3号橋	4.6m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
164	平町2号橋	3.5m	1径間	RC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
165	吉地2号橋	10.3m	2径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
166	小谷場橋	21.7m	1径間	PC橋	T　桁	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
167	田入道6号橋	15.7m	1径間	PC橋	T　桁	1995年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
168	田入道2号橋	16.0m	1径間	PC橋	T　桁	1995年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
169	平町5号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
170	湯埣6号橋	4.5m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
171	内の目1号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
172	新加美田1号線1号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
173	新加美田・新指橋線1号橋	2.5m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
174	渋川橋	15.6m	1径間	PC橋	T　桁	1991年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
175	渋川歩道橋	15.7m	1径間	PC橋	箱桁	1991年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
176	山根前1号橋	2.5m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
177	舘前橋	3.5m	1径間	BOX	BOX	1988年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
178	大泉幹線用水路2号橋	4.3m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
179	うずみ橋	4.3m	1径間	BOX	BOX	1976年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
180	小倉排水1号橋	3.6m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
181	大江堀3号橋	8.5m	1径間	PC橋	桁橋	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
182	沙河場橋	7.3m	1径間	鋼橋	H桁	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
183	大泉幹線用水24号橋	4.2m	1径間	RC橋	桁橋	1988年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
184	良兵衛橋	4.6m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
185	大泉幹線用水10号橋	3.8m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
186	狐崎1号橋	9.0m	1径間	鋼橋	I桁	1976年	指定なし	2級	河　川	Ⅱ
187	大泉幹線用水15号橋	4.5m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	2級	河　川	Ⅱ
188	大泉幹線用水25号橋	4.2m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
189	八幡浦橋	3.3m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
190	戊号根付1号橋	10.5m	1径間	PC橋	箱桁	1996年	指定なし	2級	河　川	Ⅰ
191	大泉幹線用水9号橋	4.1m	1径間	BOX	BOX	1977年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
192	丁号根付8号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
193	丁号根付10号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
194	丁号10号橋	3.3m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
195	二木排水2号橋	3.9m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
196	丁号根付12号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
197	丁号12号橋	3.3m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
198	揚地根付1号橋	2.1m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
199	中田12号排水10号橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
200	中田12号排水8号橋	2.4m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
201	戊号根付4号橋	6.0m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
202	大泉幹線用水11号橋	3.7m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
203	大泉幹線用水12号橋	3.5m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
204	大泉幹線用水13号橋	3.5m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
205	大泉幹線用水14号橋	3.5m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
206	二木排水1号橋	5.4m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
207	二木排水3号橋	5.4m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
208	茨島江3号橋	2.1m	1径間	RC橋	床版橋	1988年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
209	大水門排水1号橋	4.8m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
210	浅水江7号橋	5.0m	1径間	BOX	BOX	1993年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
211	大泉幹線用水16号橋	3.5m	1径間	BOX	BOX	1988年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
212	大水門排水2号橋	5.1m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
213	浅水江8号橋	2.4m	1径間	RC橋	床版橋	1988年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
214	浅水江11号橋	5.3m	1径間	PC橋	桁橋	1992年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
215	狐崎2号橋	4.6m	1径間	BOX	BOX	1988年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
216	大泉幹線用水21号橋	3.5m	1径間	BOX	BOX	1988年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
217	大泉幹線用水17号橋	3.5m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
218	浅水江9号橋	2.5m	1径間	PC橋	T桁	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
219	大泉幹線用水18号橋	3.5m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
220	大泉幹線用水19号橋	3.5m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
221	大泉幹線用水20号橋	3.7m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
222	大泉幹線用水23号橋	4.2m	1径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
223	新揚地橋	7.3m	1径間	BOX	BOX	2003年	指定なし	2級	河　川	Ⅱ
224	桜場排水6号橋	7.1m	1径間	BOX	BOX	2003年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
225	桜場排水8号橋	10.7m	1径間	PC橋	桁橋	2003年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
226	桜場排水10号橋	7.2m	1径間	BOX	BOX	2003年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
227	桜場排水12号橋	7.3m	1径間	BOX	BOX	2003年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
228	茨島江4号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	2003年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
229	桜場排水14号橋	7.3m	1径間	BOX	BOX	2003年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
230	桜場排水16号橋	7.5m	1径間	BOX	BOX	2003年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
231	桜場排水18号橋	7.5m	1径間	BOX	BOX	2003年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
232	桜場排水19号橋	9.0m	2径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
233	大泉幹線用水26号橋	4.0m	1径間	BOX	BOX	2003年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
234	大泉幹線用水22号橋	3.9m	1径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
235	浅水江10号橋	3.6m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
236	水越幹線用水9号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1989年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
237	水越幹線10号橋	2.8m	1径間	BOX	BOX	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
238	水越幹線用水11号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
239	水越幹線用水13号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
240	水越幹線用水14号橋	3.3m	1径間	BOX	BOX	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
241	十文字1号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1984年	2次	その他	河　川	Ⅰ
242	水越幹線用水16号橋	3.2m	1径間	BOX	BOX	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
243	新糠塚橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1988年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
244	白地排水9号橋	4.6m	1径間	BOX	BOX	1988年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
245	白地排水7号橋	7.0m	1径間	PC橋	T桁	1988年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
246	二木排水5号橋	6.2m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
247	二木排水7号橋	6.2m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
248	二木排水8号橋	10.5m	1径間	鋼橋	H桁	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
249	元町頭2号橋	9.4m	1径間	PC橋	床版橋	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
250	桜場排水24号橋	11.9m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	2級	河　川	Ⅰ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
251	今道橋	9.4m	1径間	PC橋	床版橋	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
252	桜場排水21号橋	11.0m	1径間	鋼橋	I桁	1983年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
253	新蟹甲橋	5.3m	1径間	PC橋	桁橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
254	越戸橋	13.0m	1径間	PC橋	桁橋	1994年	指定なし	2級	河　川	Ⅱ
255	新井田江14号橋	3.2m	1径間	BOX	BOX	1989年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
256	新井田江15号橋	3.9m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
257	二ツ石橋	3.2m	1径間	BOX	BOX	1989年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
258	駒牽上江1号橋	3.0m	1径間	RC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
259	加賀野江2号橋	3.0m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
260	加賀野北橋	4.6m	1径間	BOX	BOX	1992年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
261	新堰5号橋	3.4m	1径間	RC橋	床版橋	1989年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
262	川面1号橋	6.9m	1径間	RC橋	床版橋	1971年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
263	水越幹線用水7号橋	5.6m	1径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
264	水越幹線用水1号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
265	水越幹線用水6号橋	3.3m	1径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
266	水越幹線用水4号橋	3.3m	1径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
267	水越幹線用水3号橋	3.3m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
268	水越幹線用水2号橋	3.3m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
269	川面2号橋	3.4m	1径間	RC橋	床版橋	1962年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
270	西川面排水1号橋	5.3m	1径間	PC橋	桁橋	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
271	西川面排水2号橋	5.3m	1径間	PC橋	桁橋	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
272	五ヶ村排水4号橋	9.4m	1径間	PC橋	桁橋	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
273	西川面排水3号橋	5.3m	1径間	PC橋	桁橋	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
274	大泉幹線用水27号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
275	大泉幹線用水28号橋	3.1m	1径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
276	伊神城後橋	2.7m	1径間	RC橋	桁橋	1961年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
277	東部大排9号橋	6.8m	2径間	BOX	BOX	1981年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
278	東部大排2号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1980年	指定なし	2級	河　川	Ⅱ
279	東部大排西橋	8.4m	1径間	PC橋	I桁	1980年	指定なし	2級	河　川	Ⅱ
280	新田3号橋	8.5m	1径間	PC橋	桁橋	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
281	東部大排3号橋	10.4m	1径間	PC橋	桁橋	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
282	長石橋	3.4m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
283	佐橋	2.5m	1径間	RC橋	床版橋	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
284	新田1号橋	6.3m	1径間	PC橋	I桁	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
285	新田2号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
286	大明神橋	3.4m	1径間	RC橋	桁橋	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
287	東部大排4号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
288	東部大排5号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
289	東部大排6号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
290	東部大排7号橋	10.4m	1径間	PC橋	桁橋	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
291	東部大排10号橋	10.4m	1径間	PC橋	I桁	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
292	東部大排11号橋	10.4m	1径間	PC橋	桁橋	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
293	東部大排12号橋	10.4m	1径間	PC橋	桁橋	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
294	東部大排1号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
295	二橋前橋	3.4m	1径間	RC橋	床版橋	1974年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
296	西部大排1号橋	5.6m	1径間	PC橋	桁橋	1983年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
297	大泉幹線用水31号橋	4.0m	1径間	RC橋	桁橋	1981年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
298	南線1号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1984年	指定なし	2級	河　川	Ⅰ
299	大泉幹線用水29号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
300	大泉幹線用水30号橋	3.5m	1径間	BOX	BOX	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
301	大泉幹線用水32号橋	3.5m	1径間	BOX	BOX	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
302	大泉幹線用水33号橋	3.5m	1径間	BOX	BOX	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
303	南線3号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
304	南線2号橋	2.0m	1径間	BOX	BOX	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
305	新井田江34号橋	4.6m	1径間	RC橋	床版橋	1955年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
306	岩刈2号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
307	姥沼排水10号橋	3.6m	1径間	RC橋	桁橋	1957年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
308	姥沼排水9号橋	3.6m	1径間	RC橋	桁橋	1957年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
309	姥沼排水8号橋	3.6m	1径間	RC橋	桁橋	1957年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
310	柴垣前橋	3.6m	1径間	RC橋	桁橋	1957年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
311	姥沼排水6号橋	3.6m	1径間	RC橋	床版橋	1957年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
312	姥沼排水5号橋	3.6m	1径間	RC橋	桁橋	1957年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
313	姥沼排水4号橋	3.6m	1径間	RC橋	床版橋	1957年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
314	姥沼排水3号橋	3.6m	1径間	RC橋	桁橋	1956年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
315	岩刈7号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
316	新井田排水4号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1957年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
317	岩刈3号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
318	岩刈1号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
319	岩刈6号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
320	岩刈4号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
321	岩刈5号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
322	表橋	3.6m	1径間	RC橋	床版橋	1989年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
323	大泉幹線用水35号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
324	高堀3号橋	2.6m	1径間	RC橋	床版橋	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
325	大排1号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
326	大排2号橋	7.3m	1径間	PC橋	I桁	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
327	大排3号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
328	大排4号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
329	大排5号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
330	芝尻前排水3号橋	3.2m	1径間	BOX	BOX	2008年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
331	新井田排水2号橋	8.0m	1径間	PC橋	I桁	1956年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
332	芝尻前排水4号橋	3.2m	1径間	BOX	BOX	1989年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
333	新井田排水3号橋	8.0m	1径間	PC橋	桁橋	1956年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
334	新井田排水1号橋	3.3m	1径間	BOX	BOX	2008年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
335	芝尻前排水5号橋	3.3m	1径間	BOX	BOX	2008年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
336	川前1号橋	2.8m	1径間	BOX	BOX	1988年	指定なし	その他	市道	Ⅱ
337	北桜場1号橋	5.6m	2径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
338	水越幹線用水8号橋	5.4m	2径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
339	大江堀4号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1991年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
340	大江堀2号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1991年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
341	小倉排水2号橋	3.6m	1径間	BOX	BOX	1992年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
342	大泉幹線用水3号橋	4.1m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
343	加賀野南橋	4.6m	1径間	BOX	BOX	1993年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
344	長根橋	4.7m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
345	水越幹線用水12号橋	3.5m	1径間	BOX	BOX	2003年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
346	大泉幹線用水34号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	2003年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
347	中田三号1号線1号橋	8.4m	1径間	RC橋	床版橋	2002年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
348	中田三号2号線1号橋	3.6m	1径間	BOX	BOX	2002年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
349	中田三号2号線2号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	2002年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
350	長崎・中田3号線1号橋	7.6m	1径間	PC橋	桁橋	2002年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
351	長崎・中田3号線2号橋	8.6m	1径間	PC橋	桁橋	2002年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
352	長崎・中田2号線1号橋	7.6m	1径間	PC橋	桁橋	2002年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
353	長崎・中田1号線1号橋	7.6m	1径間	PC橋	桁橋	2002年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
354	長崎・中田1号線2号橋	8.6m	1径間	PC橋	桁橋	2002年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
355	長崎・小倉2号線1号橋	4.5m	1径間	BOX	BOX	2002年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
356	長崎・小倉2号線2号橋	2.5m	1径間	BOX	BOX	2002年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
357	長崎・小倉1号線1号橋	10.6m	1径間	PC橋	桁橋	2002年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
358	新小倉前2号線1号橋	2.4m	1径間	BOX	BOX	2002年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
359	新小倉前1号線1号橋	14.7m	1径間	PC橋	桁橋	2002年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
360	長崎・中田2号線2号橋	8.6m	1径間	PC橋	床版橋	2002年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
361	西田橋	11.2m	1径間	PC橋	桁橋	1997年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
362	浦・小島線1号橋	4.7m	2径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
363	舘・小島線1号橋	4.6m	2径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
364	西道20号線1号橋	5.7m	2径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
365	西道21号線1号橋	5.7m	2径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
366	西道22号線1号橋	5.6m	2径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
367	西道23号線1号橋	5.7m	2径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
368	西道24号線1号橋	5.6m	2径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
369	東部大排添2号線1号橋	5.7m	2径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
370	中川面3号線1号橋	3.3m	1径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
371	中川面2号線1号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
372	川前橋	11.5m	1径間	PC橋	桁橋	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
373	狐崎3号橋	4.6m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
374	新岩前橋	3.6m	1径間	RC橋	床版橋	1970年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
375	上の山・黄牛線4号橋	2.5m	1径間	BOX	BOX	2001年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
376	上の山・黄牛線5号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	2001年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
377	堂前線1号橋	2.2m	1径間	BOX	BOX	2005年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
378	雨乞沢橋	13.6m	1径間	PC橋	床版橋	1980年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
379	上の山・黄牛線1号橋	10.0m	1径間	PC橋	床版橋	2001年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
380	上の山・黄牛線2号橋	10.0m	1径間	PC橋	床版橋	1980年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
381	上の山・黄牛線3号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	2001年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
382	大柳津1号橋	7.5m	1径間	PC橋	床版橋	2005年	指定なし	2級	大柳津川	Ⅱ
383	寺川橋	11.3m	1径間	鋼橋	Ｉ桁	1980年	指定なし	2級	寺川	Ⅲ
384	樋口橋	11.9m	2径間	PC橋	床版橋	1976年	指定なし	その他	北沢川	Ⅲ
385	小杉線1号橋	2.4m	1径間	BOX	BOX	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
386	松山橋	14.0m	1径間	鋼橋	Ｉ桁	1985年	指定なし	その他	石貝川	Ⅱ
387	黄牛新岩前橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	2013年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
388	石貝橋	11.3m	1径間	PC橋	床版橋	1974年	指定なし	その他	石貝川	Ⅱ
389	新岩前7号線1号橋	4.1m	1径間	RC橋	床版橋	1970年	指定なし	その他	庵の入沢	Ⅰ
390	北沢山根線1号橋	4.0m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
391	黄金宮橋	4.5m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	黄金宮川	Ⅱ
392	水沢1号橋	13.5m	1径間	PC橋	床版橋	1989年	指定なし	その他	水沢川	Ⅰ
393	水沢大畑線1号橋	12.5m	1径間	PC橋	床版橋	1989年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
394	水沢大畑線2号橋	13.0m	1径間	PC橋	床版橋	1989年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
395	長畑橋	13.0m	1径間	PC橋	床版橋	1987年	指定なし	その他	南沢川	Ⅱ
396	長畑線1号橋	10.8m	1径間	PC橋	床版橋	1987年	指定なし	その他	長畑川	Ⅱ
397	横森線1号橋	4.3m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
398	加茂川線1号橋	3.0m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
399	竹の沢1号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1987年	指定なし	その他	竹の沢川	Ⅱ
400	細屋線1号橋	3.3m	1径間	RC橋	床版橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
401	元木橋	10.9m	1径間	PC橋	床版橋	2001年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
402	野尻支線1号橋	5.1m	1径間	BOX	BOX	2001年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
403	鉄砲町・北垈橋	10.4m	1径間	PC橋	床版橋	1987年	指定なし	その他	前舟橋～1号排水路	Ⅰ
404	新田・大谷地1号橋	9.4m	1径間	PC橋	床版橋	1987年	指定なし	その他	前舟橋～1号排水路	Ⅰ
405	大谷地・新田1号橋	9.4m	1径間	PC橋	床版橋	1987年	指定なし	その他	前舟橋～1号排水路	Ⅰ
406	大谷地・七百刈橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1987年	指定なし	その他	前舟橋～1号排水路	Ⅰ
407	新田・大谷地2号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1987年	指定なし	その他	塩釜～中江排水路	Ⅱ
408	大谷地・新田2号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1987年	指定なし	その他	塩釜～中江排水路	Ⅰ
409	午房江・亀ヶ下橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1986年	指定なし	その他	塩釜～中江排水路	Ⅱ
410	北長橋下・南長橋下橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1986年	指定なし	その他	塩釜～中江排水路	Ⅰ
411	登米三陸側道西1号橋	2.2m	1径間	BOX	BOX	2013年	指定なし	その他	前舟橋～1号排水路	Ⅱ
412	登米三陸側道東1号橋	2.2m	1径間	BOX	BOX	2013年	指定なし	その他	前舟橋～1号排水路	Ⅰ
413	雑田原・椚田橋	5.0m	1径間	RC橋	床版橋	1986年	指定なし	その他	上町～2号排水路	Ⅱ
414	登米三陸側道西2号橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	2013年	指定なし	その他	上町～2号排水路	Ⅰ
415	登米三陸側道東2号橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	2013年	指定なし	その他	上町～2号排水路	Ⅰ
416	登米南田1号線橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1986年	指定なし	その他	蛭沢～3号排水路	Ⅱ
417	登米三陸側道西3号橋	3.2m	1径間	BOX	BOX	2013年	指定なし	その他	蛭沢～3号排水路	Ⅰ
418	登米三陸側道東3号橋	3.2m	1径間	BOX	BOX	2013年	指定なし	その他	蛭沢～3号排水路	Ⅰ
419	布目・雑田原2号線橋	3.1m	1径間	BOX	BOX	1987年	指定なし	その他	蛭沢～3号排水路	Ⅱ
420	布目・雑田原1号線橋	3.1m	1径間	BOX	BOX	1987年	指定なし	その他	蛭沢～3号排水路	Ⅱ
421	布目4号橋	4.3m	1径間	RC橋	床版橋	1979年	指定なし	その他	いたち沢	Ⅱ
422	布目2号橋	4.3m	1径間	RC橋	床版橋	1979年	指定なし	その他	いたち沢	Ⅱ
423	辺室山1号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1999年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
424	道第36号の2号橋	13.6m	1径間	PC橋	T 桁	1990年	指定なし	その他	小池沢	Ⅱ
425	道第36号の1号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	小池沢	Ⅱ
426	浦小路黄牛1号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1997年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
427	峯畑前橋	2.2m	1径間	BOX	BOX	1997年	指定なし	その他	大玉排水路	Ⅱ
428	道第47号の1号橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	1997年	指定なし	その他	大玉排水路	Ⅰ
429	日根牛新峯畑12号1号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1997年	指定なし	その他	大玉排水路	Ⅱ
430	新五郎橋	4.0m	1径間	RC橋	床版橋	1970年	指定なし	その他	小池沢	Ⅱ
431	道第46号の1号橋	2.4m	1径間	BOX	BOX	2002年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
432	登米浅部1号橋	3.8m	2径間	BOX	BOX	1986年	2次	その他	登米2号幹線排水路	Ⅱ
433	つづら渕小島1号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1986年	指定なし	1級	前舟橋～1号排水路	Ⅰ
434	銅谷布目1号橋	2.2m	1径間	RC橋	床版橋	1986年	指定なし	2級	布ノ目幹線用水路	Ⅲ
435	北沢1号橋	10.5m	1径間	PC橋	床版橋	1973年	指定なし	2級	斥侯川上流	Ⅱ
436	北沢2号橋	2.6m	1径間	RC橋	床版橋	1971年	指定なし	2級	斥侯川上流	Ⅰ
437	北沢3号橋	9.2m	1径間	PC橋	床版橋	1972年	指定なし	2級	斥侯川上流	Ⅱ
438	北沢4号橋	9.8m	1径間	PC橋	床版橋	1972年	指定なし	2級	斥侯川上流	Ⅱ
439	北沢5号橋	8.0m	1径間	PC橋	床版橋	1971年	指定なし	2級	斥侯川上流	Ⅱ
440	北沢6号橋	8.0m	1径間	PC橋	床版橋	1971年	指定なし	2級	斥侯川上流	Ⅱ
441	北沢7号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1971年	指定なし	2級	斥侯川上流	Ⅰ
442	東針田成沢橋	4.4m	1径間	RC橋	床版橋	1985年	指定なし	2級	登米幹線排水路	Ⅱ
443	山田橋	3.0m	1径間	RC橋	床版橋	1970年	指定なし	その他	山田沢	Ⅱ
444	湯沢橋	7.3m	1径間	PC橋	床版橋	1986年	指定なし	その他	湯沢	Ⅰ
445	阿羅田橋	2.7m	1径間	RC橋	床版橋	1976年	指定なし	その他	田谷～浦小路	Ⅱ
446	丸子橋	4.4m	1径間	鋼橋	桁橋	1976年	指定なし	その他	小池沢	Ⅱ
447	五郎峯会館前橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1987年	指定なし	その他	小池沢	Ⅱ
448	熊野神社前橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1987年	指定なし	その他	小池沢	Ⅰ
449	斥侯川管理橋	12.5m	1径間	PC橋	床版橋	1987年	指定なし	その他	斥侯川	Ⅰ
450	大野沢橋	8.0m	1径間	PC橋	床版橋	1987年	指定なし	その他	斥侯川上流	Ⅱ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
451	雑田原4号線1号橋	2.1m	1径間	RC橋	床版橋	1986年	指定なし	その他	上町～2号排水路	Ⅱ
452	高の橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
453	目子待井午房坂1号橋	3.0m	1径間	RC橋	床版橋	1976年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
454	目子待井東1号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1976年	指定なし	その他	河川	Ⅰ
455	新町辺室山1号橋	3.1m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	登米2号幹線排水路	Ⅱ
456	養雲寺脇橋	4.0m	1径間	RC橋	床版橋	1989年	指定なし	その他	登米吉田用水路	Ⅰ
457	念佛壇橋	3.5m	1径間	BOX	BOX	1976年	指定なし	その他	登米幹線排水路	Ⅱ
458	金沢橋	3.5m	1径間	BOX	BOX	1976年	指定なし	その他	登米幹線排水路	Ⅰ
459	保呂羽沢1号橋	2.8m	1径間	BOX	BOX	1976年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
460	御小人町橋	3.7m	1径間	BOX	BOX	1989年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
461	東岡谷地1号橋	5.0m	1径間	RC橋	床版橋	1986年	指定なし	その他	上町～2号排水路	Ⅰ
462	雑田原4号線2号橋	2.1m	1径間	RC橋	床版橋	1986年	指定なし	その他	上町～2号排水路	Ⅱ
463	西針田山の上橋	7.3m	1径間	PC橋	床版橋	1986年	指定なし	その他	登米幹線用水路	Ⅱ
464	塩釜橋	4.0m	1径間	RC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	登米幹線用水路	Ⅰ
465	東針田2号橋	5.4m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	登米幹線用水路	Ⅱ
466	おんどり橋	7.3m	1径間	PC橋	床版橋	1995年	指定なし	その他	登米幹線用水路	Ⅱ
467	おんどり沢橋	7.3m	1径間	PC橋	床版橋	1995年	指定なし	その他	登米幹線用水路	Ⅱ
468	成沢1号橋	9.4m	1径間	PC橋	床版橋	1991年	指定なし	その他	成沢	Ⅱ
469	成沢2号橋	7.0m	1径間	PC橋	床版橋	1991年	指定なし	その他	成沢	Ⅰ
470	中田2号橋	5.0m	1径間	RC橋	床版橋	1976年	指定なし	その他	鱒淵川	Ⅰ
471	浅草線1号橋	2.2m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
472	山崎橋	4.6m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	1級	荒馬沢川	Ⅱ
473	鍛冶屋4号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	1級	荒馬沢川	Ⅱ
474	鍛冶屋3号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	1級	荒馬沢川	Ⅱ
475	鍛冶屋2号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	1級	荒馬沢川	Ⅱ
476	沢尻橋	5.0m	1径間	RC橋	T 桁	1973年	指定なし	1級	平倉川	Ⅱ
477	滝入橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1978年	指定なし	1級	上大関川	Ⅰ
478	鳥谷橋	5.3m	1径間	PC橋	床版橋	1980年	指定なし	1級	上大関川	Ⅱ
479	鬼伏橋	5.3m	1径間	PC橋	床版橋	1980年	指定なし	1級	上大関川	Ⅱ
480	タモサワ橋	4.6m	1径間	RC橋	床版橋	1981年	指定なし	1級	鳥谷沢川	Ⅰ
481	鍋石橋	6.4m	1径間	PC橋	床版橋	1981年	指定なし	1級	鍋石川	Ⅰ
482	落合橋	10.4m	1径間	PC橋	床版橋	1967年	指定なし	1級	上鱒淵川	Ⅱ
483	合の木橋	5.5m	1径間	PC橋	床版橋	1972年	指定なし	1級	合の木川	Ⅲ
484	さいかち橋	13.7m	1径間	PC橋	床版橋	1977年	指定なし	1級	合の木川	Ⅰ
485	八幡橋	10.4m	1径間	PC橋	床版橋	1979年	指定なし	1級	合の木川	Ⅰ
486	朴の沢1号橋	4.0m	1径間	RC橋	床版橋	1979年	指定なし	1級	朴の沢川	Ⅰ
487	朴の沢2号橋	6.0m	1径間	RC橋	床版橋	1979年	指定なし	1級	朴の沢川	Ⅰ
488	畑の沢6号橋	3.0m	1径間	RC橋	床版橋	1979年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
489	畑の沢5号橋	3.1m	1径間	RC橋	床版橋	1979年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
490	市の松橋	7.0m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	1級	乗越川	Ⅰ
491	大沢1号橋	4.3m	1径間	PC橋	桁橋	1980年	指定なし	2級	長円田川	Ⅱ
492	小峠橋	9.0m	1径間	PC橋	床版橋	1977年	指定なし	2級	岩之沢川	Ⅰ
493	つつけ橋	10.2m	1径間	PC橋	床版橋	1979年	指定なし	2級	入沢川	Ⅰ
494	蛙橋	8.0m	1径間	PC橋	床版橋	1972年	指定なし	2級	箸木川	Ⅱ
495	河鹿橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1964年	指定なし	2級	箸木川	Ⅰ
496	記一橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1964年	指定なし	2級	箸木川	Ⅱ
497	石積橋	8.0m	1径間	PC橋	床版橋	1972年	指定なし	2級	箸木川	Ⅱ
498	砂金橋	5.5m	1径間	RC橋	T 桁	1972年	指定なし	2級	河　川	Ⅰ
499	二の矢橋	12.6m	1径間	PC橋	床版橋	1992年	指定なし	2級	大関川	Ⅰ
500	寺沢1号橋	2.0m	1径間	RC橋	床版橋	1960年	指定なし	その他	寺の沢川	Ⅱ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
501	舘の下1号橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	2003年	指定なし	2級	舘の下川	Ⅱ
502	キミサ橋	3.0m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
503	平沢橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	2004年	指定なし	その他	平沢川	Ⅱ
504	土手前1号橋	4.0m	1径間	RC橋	床版橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
505	土手前2号橋	4.2m	1径間	RC橋	床版橋	1975年	指定なし	その他	平沢川	Ⅰ
506	土手前3号橋	7.3m	1径間	PC橋	床版橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
507	土手前4号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
508	土手前5号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
509	土手前6号橋	10.4m	1径間	PC橋	床版橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
510	寺門橋	2.6m	1径間	RC橋	床版橋	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
511	中田1号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	2003年	指定なし	その他	足上りさわ川	Ⅰ
512	北沢橋（教会裏線）	2.6m	1径間	RC橋	床版橋	1975年	指定なし	その他	北沢川	Ⅱ
513	町裏西1号橋	2.3m	1径間	RC橋	床版橋	1969年	指定なし	その他	大矢川	Ⅱ
514	土手1号橋	3.7m	1径間	RC橋	床版橋	1966年	指定なし	その他	北沢川	Ⅱ
515	鳥の沢橋	12.6m	2径間	RC橋	桁橋	1933年	指定なし	その他	綱木沢川	Ⅲ
516	桃取橋	10.0m	2径間	RC橋	床版橋	1965年	指定なし	その他	綱木沢川	Ⅱ
517	金畑橋	4.5m	1径間	RC橋	床版橋	1945年	指定なし	その他	板木川	Ⅰ
518	大紬橋	4.1m	1径間	RC橋	床版橋	1983年	指定なし	その他	大紬沢川	Ⅲ
519	北沢橋（米川町線）	3.4m	1径間	RC橋	床版橋	1976年	指定なし	その他	北沢川	Ⅲ
520	新中田1号橋	4.4m	1径間	RC橋	床版橋	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
521	西上沢1号橋	3.2m	1径間	RC橋	床版橋	1974年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
522	佐辺野1号橋	2.3m	1径間	RC橋	床版橋	1964年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
523	高屋敷橋	8.9m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	高屋敷川	Ⅰ
524	沢口橋	3.5m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	その他	赤沢川	Ⅰ
525	小付1号橋	2.9m	1径間	RC橋	床版橋	1972年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
526	小付2号橋	4.0m	1径間	RC橋	床版橋	1972年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
527	小付3号橋	4.0m	1径間	RC橋	床版橋	1972年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
528	第二鷹の子橋	5.4m	1径間	PC橋	床版橋	1972年	指定なし	その他	鷹の子川	Ⅰ
529	高城橋	5.3m	1径間	RC橋	床版橋	1964年	指定なし	その他	室の沢川	Ⅱ
530	大柄沢1号橋	12.2m	2径間	RC橋	床版橋	1969年	指定なし	その他	大籠川	Ⅱ
531	余玉橋	12.7m	2径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
532	地蔵沢橋	4.0m	1径間	RC橋	床版橋	1972年	指定なし	その他	地蔵川	Ⅰ
533	西内1号橋	6.4m	1径間	RC橋	床版橋	1986年	指定なし	その他	西内川	Ⅰ
534	弥惣橋	10.0m	1径間	PC橋	床版橋	1991年	指定なし	その他	弥惣川	Ⅰ
535	弥惣1号橋	5.0m	1径間	RC橋	床版橋	1976年	指定なし	その他	弥惣川	Ⅰ
536	弥惣2号橋	3.1m	1径間	RC橋	床版橋	1976年	指定なし	その他	弥惣川	Ⅱ
537	弥惣3号橋	2.7m	1径間	RC橋	床版橋	1976年	指定なし	その他	弥惣川	Ⅰ
538	弥惣4号橋	3.0m	1径間	RC橋	床版橋	1976年	指定なし	その他	弥惣川	Ⅰ
539	栃の木橋	12.5m	1径間	鋼橋	I桁	1981年	指定なし	その他	鱒淵川	Ⅲ
540	末田1号橋	7.4m	1径間	PC橋	床版橋	1974年	指定なし	その他	末田川	Ⅱ
541	末田2号橋	7.3m	1径間	PC橋	床版橋	1976年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
542	松坂1号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	松坂川	Ⅰ
543	松坂2号橋	4.8m	1径間	BOX	BOX	1970年	指定なし	その他	鱒淵川	Ⅰ
544	海無沢橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1986年	指定なし	その他	綱木沢川	Ⅰ
545	螢橋	14.0m	1径間	PC橋	床版橋	1987年	指定なし	その他	鱒淵川	Ⅰ
546	上台橋	11.5m	1径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1982年	指定なし	その他	鱒淵川	Ⅱ
547	高寺1号橋	6.9m	1径間	PC橋	床版橋	1971年	指定なし	その他	高寺川	Ⅰ
548	高寺2号橋	5.4m	1径間	RC橋	床版橋	1982年	指定なし	その他	高寺川	Ⅰ
549	石橋3号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	2003年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
550	上沢尻橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1969年	指定なし	その他	平倉川	Ⅰ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
551	平倉橋	2.8m	1径間	BOX	BOX	2000年	指定なし	その他	平倉川	Ⅱ
552	雨乞1号橋	7.9m	1径間	PC橋	床版橋	1987年	指定なし	その他	上恩田川	Ⅰ
553	加賀屋敷橋	8.7m	1径間	PC橋	床版橋	1988年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
554	鍛冶屋1号橋	5.0m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	荒馬沢川	Ⅱ
555	蟹不動橋	8.2m	1径間	鋼橋	桁橋	1976年	指定なし	その他	恩田川	Ⅲ
556	天神前橋	12.9m	2径間	RC橋	床版橋	1950年	指定なし	その他	恩田川	Ⅲ
557	壇ノ崎橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	1975年	指定なし	その他	照井川	Ⅱ
558	越坂橋	4.5m	1径間	RC橋	床版橋	1973年	指定なし	その他	寺の沢川	Ⅲ
559	恩田3号橋	15.6m	1径間	PC橋	箱桁	1989年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
560	並杉橋	2.7m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	耳取川	Ⅱ
561	石橋2号橋	3.6m	1径間	RC橋	床版橋	1981年	指定なし	その他	耳取川	Ⅰ
562	宮前1号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	2000年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
563	大谷野幹線1号橋	6.4m	1径間	PC橋	床版橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
564	大谷野幹線2号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
565	大谷野2号橋	5.3m	1径間	RC橋	桁橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
566	大谷野3号橋	5.4m	1径間	RC橋	桁橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
567	大谷野4号橋	5.4m	1径間	RC橋	桁橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
568	大谷野5号橋	5.3m	1径間	RC橋	桁橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
569	大谷野6号橋	5.3m	1径間	RC橋	桁橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
570	大谷野7号橋	5.3m	1径間	RC橋	桁橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
571	大谷野8号橋	5.3m	1径間	RC橋	桁橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
572	大谷野10号橋	5.3m	1径間	RC橋	桁橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
573	大谷野11号橋	5.3m	1径間	RC橋	桁橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
574	小山田1号橋	2.4m	1径間	RC橋	床版橋	1977年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
575	畑の沢1号橋	11.7m	1径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1995年	指定なし	その他	岩之沢川	Ⅰ
576	沢橋	12.5m	1径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1980年	指定なし	その他	岩之沢川	Ⅱ
577	畑の沢2号橋	13.2m	1径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1981年	指定なし	その他	岩之沢川	Ⅰ
578	平沢1号橋	3.2m	1径間	BOX	BOX	2006年	指定なし	その他	鍋割沢川	Ⅱ
579	清水端橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1977年	指定なし	その他	乗越川	Ⅰ
580	石沢橋	2.2m	1径間	RC橋	床版橋	1961年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
581	新畑中橋	2.4m	1径間	BOX	BOX	1997年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
582	浅草周回橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
583	天沼石倉橋	3.0m	1径間	RC橋	床版橋	1989年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
584	狐穴中才橋	4.4m	1径間	RC橋	床版橋	1964年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
585	乗越・岩の沢橋	4.3m	1径間	BOX	BOX	2004年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
586	西館幹線2号橋	3.2m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	西館幹線用水路	Ⅱ
587	中原1号橋	2.8m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
588	本郷用水路1号橋	2.0m	1径間	BOX	BOX	2004年	指定なし	1級	本郷用水路	Ⅰ
589	添沼1号橋	5.4m	1径間	BOX	BOX	2010年	指定なし	1級	添沼排水路	Ⅱ
590	翌沢橋	3.6m	1径間	RC橋	床版橋	1996年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
591	舟越排水路8号橋	6.4m	1径間	RC橋	床版橋	1995年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
592	雷4号橋	8.0m	1径間	PC橋	床版橋	1999年	指定なし	1級	高石排水路	Ⅱ
593	山成排水路7号橋	5.0m	1径間	RC橋	床版橋	2005年	指定なし	1級	山成排水路	Ⅱ
594	新川橋	14.1m	1径間	鋼橋	Ⅰ 桁	1972年	指定なし	その他	新川	Ⅱ
595	山成排水路3号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	山成排水路	Ⅱ
596	山成浦橋	2.4m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
597	山成排水路6号橋	5.0m	1径間	RC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	山成排水路	Ⅰ
598	山成排水路2号橋	5.4m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	山成排水路	Ⅰ
599	山成排水路1号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	山成排水路	Ⅰ
600	青島浦橋	7.4m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
601	沢田2号橋	5.0m	1径間	RC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
602	沢田1号橋	4.5m	1径間	RC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
603	高石用水路1号橋	2.2m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	高石用水路	Ⅰ
604	高石用水路2号橋	2.3m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	高石用水路	Ⅱ
605	南方用水路3号橋	3.0m	1径間	RC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	南方用水路	Ⅰ
606	南方用水路2号橋	5.0m	1径間	RC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	南方用水路	Ⅰ
607	山成排水路8号橋	5.5m	1径間	RC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	山成排水路	Ⅰ
608	沢田浦橋	7.4m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	北方排水路	Ⅰ
609	西館幹線1号橋	5.3m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	西館幹線用水路	Ⅰ
610	二ツ橋	5.2m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
611	板倉1号橋	3.1m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
612	板倉2号橋	4.5m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
613	山成排水路10号橋	5.5m	1径間	RC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	山成排水路	Ⅰ
614	山成排水路11号橋	5.1m	1径間	RC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	山成排水路	Ⅰ
615	山成排水路12号橋	5.0m	1径間	RC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	山成排水路	Ⅰ
616	山成排水路13号橋	5.0m	1径間	RC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	山成排水路	Ⅰ
617	山成排水路14号橋	5.5m	1径間	RC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	山成排水路	Ⅱ
618	南方用水路4号橋	5.0m	1径間	RC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	南方用水路	Ⅰ
619	南方用水路5号橋	3.0m	1径間	RC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	南方用水路	Ⅰ
620	山吉田幹線3号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	山吉田幹線用水路	Ⅰ
621	雷3号橋	3.6m	1径間	RC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	高石用水路	Ⅱ
622	雷2号橋	3.6m	1径間	RC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
623	辻橋	2.0m	1径間	RC橋	床版橋	1975年	指定なし	その他	山吉田幹線用水路	Ⅱ
624	雷1号橋	2.0m	1径間	RC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	山吉田幹線用水路	Ⅱ
625	山吉田幹線2号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	山吉田幹線用水路	Ⅱ
626	大門1号橋	5.3m	1径間	PC橋	床版橋	1992年	指定なし	その他	高石用水路	Ⅱ
627	大門2号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
628	大門3号橋	2.7m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
629	大門4号橋	5.4m	1径間	PC橋	床版橋	1992年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
630	山吉田幹線1号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	山吉田幹線用水路	Ⅱ
631	東川前橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	梶沼用水路	Ⅰ
632	新田前橋	2.0m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	梶沼用水路	Ⅰ
633	大畑排水路2号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
634	中原2号橋	4.0m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
635	原前橋	8.7m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
636	大岳排水路4号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	大岳排水路	Ⅰ
637	大岳排水路3号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	大岳排水路	Ⅱ
638	大岳排水路2号橋	9.4m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	大岳排水路	Ⅱ
639	大袋排水路5号橋	7.3m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	大袋排水路	Ⅰ
640	米袋浦橋	7.3m	1径間	PC橋	床版橋	1988年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
641	樟橋	3.9m	1径間	RC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
642	大袋1号橋	3.4m	1径間	RC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	大袋排水路	Ⅰ
643	大袋排水路1号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	大袋排水路	Ⅰ
644	大袋2号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	大袋排水路	Ⅰ
645	大袋排水路3号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	大袋排水路	Ⅱ
646	大袋排水路2号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	大袋排水路	Ⅰ
647	山成前3号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
648	高石用水路3号橋	2.2m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	高石用水路	Ⅰ
649	高石用水路4号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	その他	高石用水路	Ⅰ
650	山成前1号橋	2.2m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	高石用水路	Ⅲ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
651	高石用水路5号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	高石用水路	Ⅱ
652	山成前2号橋	5.5m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	高石用水路	Ⅰ
653	大畑排水路1号橋	2.7m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	大畑排水路	Ⅱ
654	雷橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
655	山成前5号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
656	山成前6号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	大袋排水路	Ⅰ
657	山成前7号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
658	山成前8号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
659	大袋排水路6号橋	7.3m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	大袋排水路	Ⅰ
660	山成前9号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
661	大袋排水路7号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	大袋排水路	Ⅱ
662	大袋排水路8号橋	7.3m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	大袋排水路	Ⅰ
663	大岳排水路5号橋	9.4m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	大岳排水路	Ⅰ
664	大岳排水路6号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	大岳排水路	Ⅱ
665	大岳排水路7号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	大岳排水路	Ⅱ
666	大畑排水路3号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	大畑排水路	Ⅰ
667	表前2号橋	5.0m	1径間	RC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
668	角ノ欠前橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
669	狭堤橋	8.4m	1径間	RC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
670	大平橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
671	間内下橋	6.0m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
672	沼崎下1号橋	5.0m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
673	差橋	2.0m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
674	駒林川5号橋	11.1m	1径間	PC橋	床版橋	1994年	指定なし	その他	駒林川	Ⅰ
675	駒林川1号橋	8.6m	2径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	駒林川	Ⅱ
676	駒林川4号橋	5.8m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	駒林川	Ⅱ
677	中沼崎1号橋	3.1m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
678	中沼崎2号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
679	沼崎下2号橋	3.3m	1径間	RC橋	床版橋	1989年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
680	駒林川3号橋	8.4m	2径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	駒林川	Ⅲ
681	駒林川2号橋	9.1m	2径間	鋼橋	H　桁	1980年	指定なし	その他	駒林川	Ⅲ
682	新畑岡下1号橋	7.3m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
683	新畑岡下2号橋	7.3m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
684	添沼5号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
685	中須崎2号橋	3.6m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
686	中須崎1号橋	3.4m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
687	舟越排水路5号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1992年	指定なし	その他	舟越排水路	Ⅰ
688	添沼4号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
689	添沼3号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
690	添沼2号橋	9.4m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	添沼排水路	Ⅱ
691	添沼7号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	添沼排水路	Ⅰ
692	添沼6号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	添沼排水路	Ⅰ
693	大平5号橋	3.5m	1径間	PC橋	床版橋	1992年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
694	新青島裏橋	11.2m	1径間	PC橋	床版橋	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
695	舟越排水路3号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
696	舟越排水路4号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
697	舟越排水路6号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
698	舟越排水路7号橋	6.4m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
699	舟越排水路9号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
700	中ノ口・大森前1号橋	2.3m	1径間	RC橋	床版橋	1977年	指定なし	2級	河　川	Ⅰ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
701	山成前4号橋	7.3m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
702	大袋排水路10号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
703	新青島前橋	15.5m	2径間	BOX	BOX	2000年	指定なし	2級	河　川	Ⅱ
704	山成排水路4号橋	10.4m	1径間	鋼橋	Ｉ 桁	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
705	山成排水路5号橋	5.0m	1径間	RC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
706	大岳排水路1号橋	5.4m	1径間	RC橋	ラーメン	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
707	松葉・田中浦1号橋	9.4m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
708	大畑排水路4号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
709	下谷地橋	14.6m	1径間	PC橋	床版橋	1988年	2次	1級	長沼川	Ⅱ
710	斜橋	14.5m	1径間	鋼橋	桁橋	1963年	指定なし	1級	新堰用水路	Ⅲ
711	中橋	11.4m	2径間	RC橋	Ｔ 桁	1967年	指定なし	1級	新川	Ⅲ
712	吐出橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1982年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
713	大排7号橋	8.5m	1径間	PC橋	床版橋	1982年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
714	森排水路5号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1982年	指定なし	その他	森排水路	Ⅱ
715	大排6号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1982年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
716	森排水路4号橋	5.3m	1径間	PC橋	床版橋	1982年	指定なし	その他	森排水路	Ⅱ
717	大排5号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1982年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
718	森排水路3号橋	5.3m	1径間	PC橋	床版橋	1982年	指定なし	その他	森排水路	Ⅱ
719	大排4号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1982年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
720	大排3号橋	7.3m	1径間	PC橋	床版橋	1982年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
721	森排水路1号橋	5.3m	1径間	PC橋	床版橋	1982年	指定なし	その他	森排水路	Ⅱ
722	大排2号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1983年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
723	大排1号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1983年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
724	表前橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	2004年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
725	大江橋	12.8m	1径間	PC橋	Ｔ 桁	1956年	2次	1級	長沼川	Ⅲ
726	戈助橋	9.1m	4径間	RC橋	床版橋	1976年	指定なし	その他	長沼川	Ⅲ
727	下田中橋	13.6m	1径間	PC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	長沼川	Ⅲ
728	西舘橋	7.3m	1径間	RC橋	床版橋	1976年	指定なし	その他	長沼川	Ⅱ
729	西舘中橋	2.6m	1径間	RC橋	床版橋	1976年	指定なし	その他	長沼川	Ⅱ
730	御陣場橋	8.0m	2径間	RC橋	Ｔ 桁	1976年	指定なし	その他	長沼川	Ⅲ
731	菜園2号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
732	寺浦橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
733	散田橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1987年	指定なし	1級	河　川	Ⅲ
734	駒木橋	3.5m	1径間	RC橋	床版橋	1987年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
735	江合2号橋	5.0m	1径間	PC橋	床版橋	1987年	指定なし	その他	長沼川	Ⅱ
736	十五畴2号橋	5.3m	1径間	RC橋	床版橋	2004年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
737	十五畴1号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	2004年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
738	中沢橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	2002年	指定なし	2級	長沼川	Ⅱ
739	七日市場橋	8.5m	1径間	PC橋	床版橋	2002年	指定なし	その他	長沼川	Ⅱ
740	下北浦4号橋	7.3m	1径間	PC橋	床版橋	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
741	下北浦2号橋	7.3m	1径間	PC橋	床版橋	1986年	指定なし	その他	北浦排水路	Ⅱ
742	舟橋排水路橋	7.3m	1径間	PC橋	床版橋	1986年	指定なし	その他	船橋排水路	Ⅱ
743	新中道4号橋	2.7m	1径間	BOX	BOX	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
744	西谷地橋	5.0m	1径間	RC橋	床版橋	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
745	砂山橋	2.5m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
746	飯土井前1号橋	9.5m	1径間	PC橋	床版橋	1987年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
747	南行橋	8.5m	1径間	PC橋	床版橋	1993年	指定なし	2級	長沼川	Ⅱ
748	地粮橋2号橋	12.5m	1径間	PC橋	床版橋	1992年	指定なし	その他	長沼川	Ⅱ
749	早稲田橋1号橋	12.5m	1径間	PC橋	床版橋	1993年	指定なし	その他	長沼川	Ⅱ
750	早稲田橋	9.5m	1径間	PC橋	桁橋	1979年	指定なし	その他	長沼川	Ⅱ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
751	天形前用水路1号橋	3.1m	1径間	RC橋	床版橋	1977年	指定なし	その他	天形前用水路	Ⅱ
752	天形前用水路2号橋	2.4m	1径間	RC橋	床版橋	1977年	指定なし	その他	天形前用水路	Ⅲ
753	天形前用水路5号橋	2.4m	1径間	RC橋	床版橋	1977年	指定なし	2級	天形前用水路	Ⅱ
754	天形前用水路6号橋	2.0m	1径間	RC橋	床版橋	1977年	指定なし	2級	天形前用水路	Ⅱ
755	天形前用水路7号橋	2.2m	1径間	RC橋	床版橋	1976年	指定なし	その他	天形前用水路	Ⅱ
756	天形前用水路8号橋	2.2m	1径間	RC橋	床版橋	1976年	指定なし	2級	天形前用水路	Ⅱ
757	天形前用水路9号橋	2.4m	1径間	RC橋	床版橋	1976年	指定なし	その他	天形前用水路	Ⅱ
758	北方承水路1号橋	4.9m	1径間	RC橋	床版橋	1976年	指定なし	その他	北方承水路	Ⅱ
759	北方承水路2号橋	5.0m	1径間	RC橋	床版橋	1976年	指定なし	その他	北方承水路	Ⅱ
760	北方承水路3号橋	2.8m	1径間	RC橋	床版橋	1975年	指定なし	その他	北方承水路	Ⅱ
761	北方承水路4号橋	2.8m	1径間	RC橋	床版橋	1975年	指定なし	その他	北方承水路	Ⅱ
762	北方承水路5号橋	3.1m	1径間	RC橋	床版橋	1975年	指定なし	その他	北方承水路	Ⅱ
763	天形排水路1号橋	5.3m	1径間	PC橋	床版橋	1977年	指定なし	その他	天形排水路	Ⅱ
764	天形排水路2号橋	5.4m	1径間	PC橋	床版橋	1977年	指定なし	その他	天形排水路	Ⅱ
765	天形排水路3号橋	5.2m	1径間	PC橋	床版橋	1977年	指定なし	その他	天形排水路	Ⅱ
766	天形排水路4号橋	5.3m	1径間	PC橋	床版橋	1977年	指定なし	2級	天形排水路	Ⅱ
767	天形排水路5号橋	5.3m	1径間	PC橋	床版橋	1977年	指定なし	その他	天形排水路	Ⅱ
768	天形排水路6号橋	5.3m	1径間	PC橋	床版橋	1977年	指定なし	その他	天形排水路	Ⅱ
769	天形排水路7号橋	5.5m	1径間	PC橋	桁橋	1977年	指定なし	その他	天形排水路	Ⅱ
770	鴻巣沢用水路1号橋	3.0m	1径間	RC橋	床版橋	1977年	指定なし	その他	鴻ノ巣沢用水路	Ⅱ
771	鴻巣沢用水路2号橋	2.1m	1径間	RC橋	床版橋	1977年	指定なし	2級	鴻ノ巣沢用水路	Ⅱ
772	高石排水路1号橋	11.6m	1径間	鋼橋	Ｉ 桁	1973年	指定なし	1級	高石排水路	Ⅱ
773	高石排水路2号橋	10.4m	1径間	鋼橋	Ｉ 桁	1973年	指定なし	その他	高石排水路	Ⅱ
774	高石排水路4号橋	3.6m	1径間	BOX	BOX	1972年	指定なし	その他	高石排水路	Ⅱ
775	古宿前用水路1号橋	2.5m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	古宿前用水路	Ⅱ
776	古宿前用水路2号橋	2.5m	1径間	RC橋	床版橋	1987年	指定なし	その他	古宿前用水路	Ⅱ
777	古宿前用水路3号橋	2.5m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	古宿前用水路	Ⅱ
778	古宿前用水路4号橋	2.5m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	古宿前用水路	Ⅱ
779	古宿前用水路5号橋	4.4m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	1級	古宿前用水路	Ⅱ
780	暁橋	3.4m	1径間	RC橋	床版橋	1930年	指定なし	1級	河　川	Ⅲ
781	新穴山5号橋	8.2m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
782	新穴山1号橋	3.2m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
783	東坂戸橋	3.1m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
784	坂戸1号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
785	中川橋	4.0m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	1級	河　川	Ⅲ
786	山ノ神1号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
787	山ノ神2号橋	4.3m	1径間	BOX	BOX	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
788	幸楽橋	2.8m	1径間	BOX	BOX	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
789	牛ケ沢橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
790	山田1号橋	4.2m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
791	山田2号橋	4.0m	1径間	RC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
792	彦道1号橋	3.1m	1径間	BOX	BOX	1983年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
793	伊豆崎1号橋	6.5m	1径間	PC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
794	伊豆崎2号橋	6.5m	1径間	PC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
795	伊豆崎3号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
796	伊豆崎5号橋	7.0m	1径間	PC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
797	伊豆崎7号橋	5.9m	1径間	PC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
798	錠穴橋	3.6m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
799	高崎橋	6.0m	1径間	RC橋	床版橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
800	井守沢1号橋	4.0m	2径間	RC橋	床版橋	1983年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
801	高森1号橋	4.2m	1径間	鋼橋	桁橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
802	対馬橋	6.9m	1径間	PC橋	床版橋	1998年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
803	横沢橋	5.3m	1径間	PC橋	T　桁	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
804	葉ノ木沢橋	10.4m	1径間	PC橋	床版橋	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
805	寺志田1号橋	6.1m	1径間	BOX	BOX	2013年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
806	飯土井前2号橋	9.4m	1径間	PC橋	床版橋	1987年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
807	地粮橋1号橋	12.5m	1径間	PC橋	床版橋	1993年	指定なし	その他	長沼川	Ⅱ
808	早稲田橋2号橋	12.5m	1径間	PC橋	床版橋	1992年	指定なし	その他	長沼川	Ⅱ
809	新穴山3号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
810	新穴山4号橋	8.1m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
811	新穴山6号橋	8.1m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
812	新早稲田1号橋	4.5m	1径間	BOX	BOX	1999年	指定なし	1級	長沼川	Ⅱ
813	東表前・吐出3号線1号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
814	新滝橋	4.9m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
815	板橋線1号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	2002年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
816	大形線1号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	2級	河　川	Ⅱ
817	新穴山15号線1号橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
818	新穴山8号橋	3.6m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
819	新穴山7号橋	3.6m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
820	西坂戸橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
821	狼ノ欠橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
822	上北浦1号橋	3.1m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
823	上北浦2号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
824	上北浦3号橋	2.7m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
825	上北浦4号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
826	下北浦3号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
827	山ノ神3号橋	4.2m	1径間	BOX	BOX	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
828	伊豆崎8号橋	2.5m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
829	伊豆崎9号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
830	伊豆崎10号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
831	新田1号橋	2.5m	1径間	BOX	BOX	1993年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
832	新中道3号橋	2.7m	1径間	BOX	BOX	1993年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
833	前沼・彦道線1号橋	10.9m	1径間	RC橋	桁橋	1973年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
834	深間内橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
835	外沢田・滝線1号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
836	山崎橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
837	新板橋1号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
838	新大浦2号線2号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
839	滝1号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
840	新鶴江1号橋	5.3m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
841	新鶴江2号橋	5.3m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
842	新作田橋	6.4m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
843	古川橋	24.4m	1径間	鋼橋	I　桁	1980年	指定なし	2級	古川	Ⅱ
844	大貝橋	14.4m	1径間	鋼橋	I桁	1977年	指定なし	2級	河　川	Ⅰ
845	228-1号橋	14.6m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
846	231-1号橋	14.2m	1径間	鋼橋	I桁	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
847	草刈橋	14.4m	1径間	鋼橋	I桁	1977年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
848	大久保橋	14.5m	1径間	PC橋	桁橋	1977年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
849	足洗橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
850	150号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1979年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
851	大貝橋（大貝堤線）	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
852	櫓場橋	10.5m	1径間	鋼橋	桁橋	1981年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
853	末田橋	9.5m	1径間	PC橋	桁橋	1984年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
854	永沢橋	6.0m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
855	猿ヶ崎橋	3.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
856	8-5号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
857	中ノ橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	2級	河　川	Ⅱ
858	13-1号橋	2.0m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	2級	河　川	Ⅱ
859	13-2号橋	10.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	2級	河　川	Ⅰ
860	14-1号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	2級	河　川	Ⅱ
861	18-1号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	2級	河　川	Ⅱ
862	24-1号橋（車道）	11.2m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	2級	河　川	Ⅱ
863	43-1号橋	12.6m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
864	54-1号橋	6.0m	1径間	PC橋	T桁	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
865	56-1号橋	6.0m	1径間	PC橋	T桁	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
866	58-1号橋	6.0m	1径間	PC橋	T桁	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
867	59-1号橋	6.0m	1径間	PC橋	T桁	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
868	60-1号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
869	61-1号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
870	80-1号橋	3.8m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
871	82-1号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
872	84-1号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
873	85-1号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
874	87-1号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
875	88-1号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
876	89-1号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
877	90-1号橋	5.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
878	92-1号橋	3.5m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
879	93-1号橋	5.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
880	94-1号橋	3.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
881	95-1号橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
882	101-1号橋	2.7m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
883	106-1号橋	6.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
884	112-1号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
885	113-1号橋	6.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
886	117-1号橋	3.1m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
887	118-1号橋	3.2m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
888	126-1号橋	2.1m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
889	127-1号橋	2.4m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
890	128-1号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
891	日高見橋	10.4m	1径間	PC橋	桁橋	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
892	131-1号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
893	132-1号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
894	133-1号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
895	135-1号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
896	164-1号橋	2.1m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
897	166-1号橋	2.0m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
898	188-1号橋	5.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
899	224-1号橋	11.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
900	226-1号橋	11.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
901	226-2号橋	11.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
902	227-1号橋	9.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
903	228-2号橋	10.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
904	228-3号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
905	241-1号橋	7.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
906	241-2号橋	9.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
907	242-1号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
908	242-2号橋	9.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
909	245-1号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
910	246-1号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
911	249-1号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
912	249-2号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
913	250-1号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
914	250-2号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
915	251-1号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
916	251-2号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
917	252-1号橋	6.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
918	252-2号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
919	253-1号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
920	253-2号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
921	256-1号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
922	257-1号橋	4.0m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
923	259-1号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
924	262-1号橋	6.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
925	263-1号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
926	274-1号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
927	275-1号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
928	276-1号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
929	277-1号橋	4.0m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
930	278-1号橋	5.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
931	279-1号橋	5.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
932	280-1号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
933	281-1号橋	5.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
934	283-1号橋	5.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
935	286-1号橋	3.9m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
936	303-1号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
937	304-1号橋	5.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
938	304-2号橋	8.5m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
939	304-3号橋	5.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
940	305-1号橋	5.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
941	305-2号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
942	305-3号橋	5.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
943	306-1号橋	5.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
944	306-2号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
945	306-3号橋	5.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
946	307-1号橋	5.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
947	307-2号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
948	307-3号橋	5.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
949	308-1号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
950	309-1号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
951	309-2号橋	5.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
952	311-1号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
953	332-1号橋	5.0m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
954	382-1号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
955	382-2号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
956	382-3号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
957	383-1号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
958	383-2号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
959	383-3号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
960	213-1号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
961	213-2号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
962	213-3号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
963	385-1号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
964	385-2号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
965	386-1号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
966	386-2号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
967	386-3号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
968	388-1号橋	5.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
969	388-2号橋	5.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
970	388-3号橋	5.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
971	390-1号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
972	390-2号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
973	390-3号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
974	392-1号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
975	392-2号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
976	392-3号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
977	392-4号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
978	393-1号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
979	393-2号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
980	393-3号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
981	393-4号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
982	394-1号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
983	平垈前4号線1号橋	3.0m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
984	新立野線1号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
985	410-1号橋	6.0m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
986	410-2号橋	6.0m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
987	立野3号線2号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
988	412-1号橋	5.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
989	462-1号橋	9.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
990	463-1号橋	9.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
991	464-1号橋	7.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
992	465-1号橋	10.5m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
993	466-1号橋	10.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
994	467-1号橋	10.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
995	468-1号橋	7.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
996	491-1号橋	2.0m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
997	492-1号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
998	493-1号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
999	494-1号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1000	495-1号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
1001	532-1号橋	6.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1002	533-1号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1003	534-1号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1004	556-1号橋	4.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1005	560-1号橋	2.5m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1006	567-1号橋	2.3m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1007	581-1号橋	5.9m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1008	591-1号橋	4.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1009	592-1号橋	5.6m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1010	594-2号橋	5.6m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1011	595-1号橋	4.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1012	595-2号橋	5.6m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1013	610-1号橋	5.8m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1014	高屋敷橋	8.5m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1015	中の窪線1号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1016	森の腰線1号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1017	森の腰北橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1018	内寄橋	4.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1019	636-1号橋	5.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1020	吉田前4号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1021	643-1号橋	2.4m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1022	小待井橋	2.4m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1023	猿ヶ崎下橋	4.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1024	猿ヶ崎北橋	2.7m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1025	648-1号橋	2.5m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1026	善王寺前1号橋	8.9m	1径間	鋼橋	I桁	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1027	善王寺前2号橋	8.9m	1径間	鋼橋	I桁	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1028	善王寺前3号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1029	善王寺前4号橋	8.9m	1径間	鋼橋	I桁	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1030	善王寺前5号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1031	善王寺前6号橋	8.9m	1径間	鋼橋	I桁	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1032	善王寺前7号橋	8.9m	1径間	鋼橋	I桁	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1033	吉田前1号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1034	吉田前2号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1035	吉田前3号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1036	666-2号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1037	667-1号橋	6.0m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1038	吉田前5号橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1039	山吉田小待井線1号橋	6.0m	1径間	BOX	BOX	1982年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1040	669-1号橋	6.0m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1041	善王寺前橋	12.5m	1径間	PC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1042	中道前線1号橋	10.4m	1径間	PC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1043	八反橋	10.1m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1044	684-1号橋	5.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1045	685-1号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1046	壇の前11号線1号橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1047	24-2号橋	5.5m	1径間	BOX	BOX	2003年	指定なし	2級	河　川	Ⅰ
1048	江浪・田畑線1号橋	10.4m	1径間	PC橋	桁橋	1993年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
1049	瀬ヶ崎裏3号線1号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1050	新一の曲橋	18.3m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	古川	Ⅱ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
1051	長根前1号線1号橋	2.7m	1径間	BOX	BOX	1973年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1052	八反1号線1号橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	1973年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1053	鳥越唐崎線1号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
1054	上沼田西3号線1号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1055	中沼田西4号線1号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	2000年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1056	鳥越唐崎線2号橋	2.2m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
1057	下沼田6号橋	2.7m	1径間	BOX	BOX	2000年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1058	唐崎1号線1号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1995年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1059	大崎3号線1号橋	2.7m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1060	大崎5号線1号橋	2.7m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1061	大崎4号線1号橋	2.2m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1062	十丁田1号線1号橋	2.2m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1063	十丁田3号線1号橋	2.2m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1064	大崎3号線2号橋	2.7m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1065	大崎5号線2号橋	2.7m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1066	大崎4号線2号橋	2.2m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1067	大崎線1号橋	2.2m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
1068	新切津1号線1号橋	2.2m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1069	町浦4号線1号橋	2.2m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1070	山通十五貫1号橋	6.3m	1径間	PC橋	床版橋	1982年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
1071	十丁田橋	13.5m	1径間	PC橋	床版橋	1984年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
1072	上谷地1号橋	2.8m	1径間	BOX	BOX	1989年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
1073	上谷地2号橋	3.8m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
1074	本地大沢1号橋	4.8m	1径間	BOX	BOX	1975年	指定なし	1級	大沢川	Ⅱ
1075	本地大沢2号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1974年	指定なし	1級	大沢川	Ⅱ
1076	本地大沢3号橋	3.1m	1径間	BOX	BOX	1973年	指定なし	1級	大沢川	Ⅱ
1077	竹ノ沢1号橋	3.9m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	1級	竹の沢川	Ⅱ
1078	田待1号橋	2.5m	1径間	BOX	BOX	1986年	指定なし	2級	河　川	Ⅱ
1079	小口前5号橋	5.9m	1径間	鋼橋	桁橋	1976年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1080	昭和3号橋	4.4m	1径間	RC橋	桁橋	1974年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1081	昭和2号橋	3.7m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1082	本地蕪木1号橋	5.0m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1083	本地蕪木3号橋	3.7m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1084	昭和4号橋	3.1m	1径間	BOX	BOX	1988年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1085	中沼田3号橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1086	上沼田3号橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	2000年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1087	新加々巻1号橋	5.1m	1径間	鋼橋	H 桁	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1088	八反1号橋	4.5m	1径間	PC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1089	長根前12号橋	6.0m	1径間	PC橋	床版橋	1976年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1090	長根前8号橋	3.2m	1径間	BOX	BOX	1976年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1091	長根前4号橋	3.2m	1径間	BOX	BOX	1976年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1092	長根前2号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1976年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1093	本地長根浦8号橋	3.5m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1094	本地長根浦7号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1095	本地長根浦5号橋	5.5m	1径間	RC橋	床版橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1096	本地芝下3号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1097	本地芝下1号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1098	本地芝下2号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1099	本地笑沢1号橋	3.4m	1径間	RC橋	床版橋	1976年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1100	大沢沼田1号橋	5.5m	1径間	RC橋	床版橋	1967年	指定なし	その他	竹の沢川	Ⅱ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
1101	大沢沼田2号橋	3.5m	1径間	RC橋	床版橋	1967年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1102	大沢沼田3号橋	6.0m	1径間	RC橋	床版橋	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1103	大沢沼田4号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1104	大沢沼田5号橋	8.4m	1径間	PC橋	桁橋	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1105	大沢沼田6号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1106	本地大沢5号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1107	新大沢谷岐1号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1980年	指定なし	その他	竹の沢川	Ⅰ
1108	竹の沢沼2号橋	5.1m	1径間	RC橋	床版橋	1991年	指定なし	その他	竹の沢川	Ⅱ
1109	竹の沢沼1号橋	5.1m	1径間	RC橋	床版橋	1991年	指定なし	その他	竹の沢川	Ⅱ
1110	竹の沢沼3号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	竹の沢川	Ⅱ
1111	十二沢7号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1991年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1112	十二沢6号橋	2.5m	1径間	BOX	BOX	1991年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1113	十二沢3号橋	4.0m	1径間	RC橋	床版橋	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1114	十二沢2号橋	2.8m	1径間	BOX	BOX	1991年	指定なし	その他	竹の沢川	Ⅰ
1115	十二沢5号橋	2.5m	1径間	BOX	BOX	1991年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1116	十二沢1号橋	3.8m	1径間	RC橋	床版橋	1991年	指定なし	その他	竹の沢川	Ⅱ
1117	十二沢4号橋	2.5m	1径間	BOX	BOX	1991年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1118	白鳥1号橋	8.5m	1径間	PC橋	床版橋	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1119	上白鳥浦1号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1120	福沢2号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1121	福沢1号橋	2.4m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1122	山根1号橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1123	南の沢1号橋	11.4m	1径間	PC橋	床版橋	1987年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1124	沢尻2号橋	5.3m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1125	沢尻1号橋	9.5m	1径間	PC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	竹の沢川	Ⅰ
1126	南の沢2号橋	7.4m	1径間	PC橋	床版橋	1986年	指定なし	その他	南の沢川	Ⅱ
1127	新田町1号橋	4.0m	1径間	RC橋	床版橋	1974年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1128	本地小口前3号橋	5.0m	1径間	RC橋	床版橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1129	西七番江3号橋	9.5m	1径間	PC橋	床版橋	1992年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1130	新田内一番江2号橋	2.5m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1131	外三番江1号橋	13.6m	1径間	PC橋	T 桁	1991年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1132	上谷地3号橋	6.0m	1径間	RC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1133	上谷地4号橋	6.0m	1径間	RC橋	床版橋	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1134	西八番江5号橋	9.4m	1径間	PC橋	床版橋	1993年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1135	東八番江1号橋	9.4m	1径間	PC橋	床版橋	1992年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1136	雷神前2号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1991年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1137	雷神前4号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1992年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1138	上大崎1号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1992年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1139	上大崎3号橋	8.4m	1径間	PC橋	床版橋	1992年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1140	山通十五貫3号橋	6.0m	1径間	RC橋	床版橋	1982年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1141	東八番江5号橋	9.4m	1径間	PC橋	床版橋	1992年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1142	下沼田8号橋	4.8m	1径間	PC橋	床版橋	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1143	下沼田7号橋	2.8m	1径間	BOX	BOX	1991年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1144	下沼田12号橋	4.0m	1径間	RC橋	床版橋	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1145	下沼田13号橋	4.2m	1径間	PC橋	床版橋	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1146	下沼田5号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1992年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1147	下沼田2号橋	4.8m	1径間	PC橋	床版橋	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1148	昭和9号橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1991年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1149	昭和7号橋	3.8m	1径間	RC橋	床版橋	1987年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1150	下沼田11号橋	2.4m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
1151	東八番江3号橋	9.4m	1径間	PC橋	床版橋	1992年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1152	昭和6号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1153	白鳥こ線道路橋	17.0m	3径間	RC橋	Ⅰ 桁	1967年	指定なし	1級	JR気仙沼線	Ⅱ
1154	新割山橋	27.6m	1径間	鋼橋	I桁	2014年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
1155	森排水路2号橋	5.3m	1径間	PC橋	床版橋	1982年	指定なし	その他	森排水路	Ⅲ
1156	新田歩道橋	77.3m	6径間	鋼橋	H桁	1983年	指定なし	その他	鉄道	Ⅱ
1157	491-2号橋	2.0m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1158	上沼廻1号線3号橋	5.6m	1径間	BOX	BOX	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1159	大谷野1号橋	5.4m	1径間	RC橋	桁橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1160	中田戊号2号線1号橋	2.0m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1161	西吐出・大谷地大排線1号橋	3.7m	1径間	BOX	BOX	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1162	新大浦・梅ヶ沢線1号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1163	飯島橋	20.0m	1径間	PC橋	桁橋	2016年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
1164	大浦前・大樟線1号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1165	湛涯橋	15.0m	3径間	RC橋	桁橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1166	黄牛橋	14.6m	1径間	BOX	BOX	2012年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1167	新野谷地5号橋	3.7m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1168	新野谷地4号橋	3.2m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1169	新野谷地3号橋	2.7m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1170	新野谷地2号橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1171	新野谷地1号橋	3.6m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1172	新大垉1号橋	2.2m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1173	小山橋	5.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1174	新高石前2号橋	2.4m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1175	新高石前1号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1176	大垉3号橋	2.4m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1177	幣崎3号橋	10.8m	3径間	RC橋	桁橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1178	幣崎2号橋	10.8m	3径間	RC橋	桁橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1179	幣崎1号橋	10.8m	3径間	RC橋	桁橋	1975年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1180	館石橋	3.2m	1径間	BOX	BOX	1975年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
1181	西向橋	6.0m	1径間	RC橋	桁橋	1997年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1182	黄牛深畑3号橋	3.2m	1径間	BOX	BOX	2001年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
1183	原前1号橋	2.0m	1径間	BOX	BOX	2005年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
1184	今道2号橋	2.7m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1185	今道1号橋	2.7m	1径間	BOX	BOX	1994年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1186	北郷8号橋	3.5m	1径間	RC橋	桁橋	1974年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1187	北郷7号橋	3.5m	1径間	RC橋	桁橋	1974年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1188	北郷6号橋	3.5m	1径間	RC橋	桁橋	1974年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1189	山根4号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1992年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
1190	押込橋	2.4m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
1191	小谷地前3号橋	3.5m	1径間	RC橋	桁橋	1980年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1192	洞堀橋	4.0m	1径間	RC橋	床版橋	1957年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
1193	新田中橋	2.8m	1径間	BOX	BOX	1993年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1194	姥沼排水11号橋	4.0m	1径間	RC橋	床版橋	1957年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
1195	水越幹線用水5号橋	3.2m	1径間	BOX	BOX	1979年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1196	新境堀3号橋	2.4m	1径間	RC橋	床版橋	1965年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1197	加賀野北用水4号橋	2.0m	1径間	BOX	BOX	1992年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1198	加賀野北用水3号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1992年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1199	加賀野北用水2号橋	2.1m	1径間	BOX	BOX	1992年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1200	小倉用水7号橋	2.0m	1径間	RC橋	床版橋	1957年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
1201	戊号根付2号橋	6.0m	1径間	BOX	BOX	1996年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1202	沖ノ田橋	2.9m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
1203	北上沢2号橋	4.7m	1径間	RC橋	床版橋	1964年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1204	北上沢1号橋	6.2m	1径間	PC橋	桁橋	1964年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1205	東綱木2号橋	5.5m	1径間	RC橋	床版橋	1988年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1206	東綱木1号橋	6.5m	1径間	RC橋	床版橋	1988年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1207	南上沢橋	2.8m	1径間	BOX	BOX	2005年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1208	城内橋	14.4m	1径間	鋼橋	I桁	1963年	指定なし	その他	河　川	Ⅲ
1209	新天神橋	15.7m	1径間	PC橋	桁橋	2008年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1210	原・中原線1号橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1211	浅草橋	37.2m	1径間	RC橋	桁橋	2013年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1212	小島4号橋	2.5m	1径間	BOX	BOX	2013年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1213	東吐出橋	2.0m	1径間	BOX	BOX	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1214	小島3号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1215	天形排水路10号橋	2.2m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1216	小島2号橋	3.5m	1径間	BOX	BOX	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1217	天形排水路11号橋	2.2m	1径間	RC橋	床版橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1218	小島1号橋	2.5m	1径間	BOX	BOX	2013年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1219	天形排水路8号橋	5.3m	1径間	PC橋	桁橋	1978年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1220	大谷地･新田3号橋	3.2m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1221	新田･大谷地3号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1990年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1222	舟越排水路1号橋	6.3m	1径間	PC橋	桁橋	1995年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1223	舟越排水路2号橋	6.4m	1径間	PC橋	桁橋	1995年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1224	登米南田5号橋	2.5m	1径間	BOX	BOX	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1225	新前沼1号橋	2.0m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1226	登米南田4号橋	2.4m	1径間	BOX	BOX	1986年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1227	新前沼2号橋	2.0m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1228	東岡谷地2号橋	5.0m	1径間	RC橋	桁橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1229	新早稲田4号橋	7.4m	1径間	PC橋	桁橋	1993年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1230	滝2号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1231	新早稲田5号橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1993年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1232	新中道5号橋	2.8m	1径間	BOX	BOX	1993年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1233	対馬2号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1993年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
1234	深間排水路5号橋	5.0m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1235	対馬1号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1236	対馬3号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1237	下対馬橋	6.5m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1238	山守屋敷橋	3.5m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1239	大浦4号橋	5.1m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	2級	河　川	Ⅰ
1240	大浦3号橋	3.4m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1241	大浦2号橋	2.6m	1径間	BOX	BOX	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅰ
1242	山田橋	5.0m	1径間	BOX	BOX	2004年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1243	新穴山2号橋	3.1m	1径間	BOX	BOX	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1244	新浦西橋	7.3m	1径間	PC橋	桁橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1245	新蓮沼橋	9.5m	1径間	PC橋	桁橋	1985年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1246	新十五丁3号橋	10.6m	1径間	PC橋	桁橋	1998年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1247	新十五丁2号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1248	新十五丁1号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	2003年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1249	宮崎橋	9.4m	1径間	PC橋	桁橋	1981年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1250	新早稲田3号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ

8. 登米市橋梁長寿命化修繕計画　対象橋梁一覧表

番号	橋梁名	諸元								
		橋長	径間	上部工 使用材料	上部工 構造形式	竣工年	緊急 輸送路	市道	交差物 （種別）	判定 区分
1251	新早稲田2号橋	2.5m	1径間	BOX	BOX	1984年	指定なし	1級	河　川	Ⅱ
1252	三方島東3号橋	2.3m	1径間	BOX	BOX	1984年	指定なし	その他	河　川	Ⅱ
1253	中川橋歩道橋	52.4m	2径間	鋼橋	I桁	2019年	指定なし	1級	河　川	Ⅰ
1254	石越橋	3.0m	1径間	BOX	BOX	1932年	3次	1級	河　川	Ⅱ
